



ABERTO
 FIS 1218
 BB

RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
 Secretário
 NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 10ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S) : PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 5.078.582,52 (cinco milhões, setenta e oito mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 10ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 359.159,70 (trezentos e cinquenta e nove mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos).
 Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	5.078.582,52
Total dos Reajustamentos -----	R\$	0,00
Valor Global Atual -----	R\$	5.078.582,52
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	4.719.422,82
Saldo desta a pagar -----	R\$	359.159,70

Palmas - TO, 13 de agosto de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Amélio Cayres
 Presidente

Márcio Pinheiro Rodrigues
 Presidente - Interviente

Amélio Cayres de Almeida
 Presidente da Assembléia Legislativa - Ordenador





AD 11
HE 1219
Bo

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatório de aprovação.pdf do documento 2025/38969/045457 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES	20/08/2025 10:59:53 Assinado por LOGIN E SENHA por: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	14/08/2025 10:34:10 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	14/08/2025 10:00:54 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	14/08/2025 09:39:51 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	13/08/2025 12:23:24 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 10ª PARCELA

Contrato: 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
Auto Executor: 1 **Data da SubContratação:** **Processo:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024
AutoContrato: 0 **Data da Parcela:** 13/08/2025 **Período de Avaliação:** 01/07/2025 a 31/07/2025
Data Parcela: 010 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Rodovia:

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Par.	Custo Total Acum. Atual.
00 . 000 LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01 . 000 PROJETOS								
02 . 000 LICENCIAMENTO								
03 . 000 EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
03 . 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	7,68925	0,00000	7,68925	7,205,81510	55,407,31376	0,00000	55,407,31376
03 . 004 MOVIMENTO DE TERRAS	%	6,45491	0,00000	6,45491	910,20820	5,875,31201	0,00000	5,875,31201
03 . 006 SUPER-ESTRUTURA	%	29,15261	0,00000	29,15261	35,991,15030	1,049,235,96815	0,00000	1,049,235,96815
03 . 007 ALVENARIAS	%	3,37065	0,00000	3,37065	10,239,84260	34,514,92546	0,00000	34,514,92546
SubTotal Sub Item.....						1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
SubTotal Item.....						1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
SubTotal Parcela.....						1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
SubTotal Parcela.....						1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 14/08/2025 10:34:11
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 14/08/2025 10:00:53
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgdt.to.gov.br/verificador> informando o código: F424105B021B5F86 | SGD:2025/38969/045461






Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 10ª PARCELA

Contrato: 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
Contrato Executor: 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024
Contrato: 0 **Data da Parcela:** 13/08/2025 **Período de Avaliação:** 01/07/2025 a 31/07/2025
Data da Parcela: 010 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS **Rodovia:**
Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant. Otda.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
10.000 PLANILHA APROVADA								
11.000 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO								
11.001 1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	0,00000	100,00000	5.856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
11.002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	19,98000	0,98000	20,96000	9.082,94830	181.477,30703	8.901,28933	190.378,59637
11.003 SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
11.004 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	90,00002	0,00000	90,00002	587,59250	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
11.005 INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.675,77630	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
11.006 SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	57,37310	0,00000	57,37310	24.614,41130	1.412.205,08096	0,00000	1.412.205,08096
11.007 VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	24,34448	13,90288	38,24736	9.509,30560	233.690,10319	133,457,99384	367.148,09703
11.010 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	8,89862	0,00000	8,89862	2.388,19990	21.251,68339	0,00000	21.251,68339
11.012 REVESTIMENTOS	%	2,11400	3,11718	5,23118	42.188,19080	89.187,94935	131,511,30178	220.699,25113
11.018 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	0,00000	15,09679	15,09679	1.090,53370	0,00000	16,463,55826	16,463,55826
11.024 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%	0,36192	3,19465	3,55647	21.544,68250	7.797,45149	68,825,56548	76.623,01697
11.025 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	50,00000	0,00000	50,00000	6.005,07440	300.253,72000	0,00000	300.253,72000
10Total Sub Item.....						3.574.389,33217	359,159,70869	3.933.549,04086
10Total Item.....						3.574.389,33217	359,159,70869	3.933.549,04086
10Parcial.....						3.574.389,33217	359,159,70869	3.933.549,04086
10Resumo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência						0,00000	0,00000	0,00000
10Parcial.....						3.574.389,33217	359,159,70869	3.933.549,04086





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 10ª PARCELA

Contrato: 000222024
 Contrato Executor: 1
 Contrato: 0
 Parcela: 010

Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
 Data da SubContratação: 0132038962023 Processo Medição: 0062830962024
 Data da Parcela: 13/08/2025 Período de Avaliação: 01/07/2025 a 31/07/2025
 Nº da O.S.: 000220022024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Valor das Parcelas..... 4.719.422,85155 359.159,70869 5.078.582,56024

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$. 359.159,70 (trezentos e cinquenta e nove mil e cento e cinquenta e nove reais e nove centavos)
 Palmas-TO, 13 de agosto de 2025.

1222
 Bb





1223
Bto

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodemedição.pdf do documento **2025/38969/045461** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	14/08/2025 10:34:11 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	14/08/2025 10:00:53 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	14/08/2025 09:39:51 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	13/08/2025 12:23:23 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Contrato: 00022/2024 **SubContrato:** 0 **Empresa:** 04.490.079/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA **Processo Medição:** 00628/3096/2024
Data da Assinatura: 28/05/2024
Valor Contrato: 18.786.000,00
Valor dos Aditivos: 0,00
Valor Total Contrato: 18.786.000,00
Prazo: 549 Dias
Prorrogações Conced.: 0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO									
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)			REAJUSTE			TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$		
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado				
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67		
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72		
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15		
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85		
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	638.331,24	2.852.207,09		
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	111.643,57	2.963.850,66		
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	0,00	0,00	606.681,32	3.570.531,98		
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,37	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	0,00	0,00	436.769,37	4.007.301,35		
9 a	01/06/2025 a 30/06/2025	712.121,47	3,79 %	4.719.422,82	25,12 %	0,00	0,00	712.121,47	4.719.422,82		
0 a	01/07/2025 a 31/07/2025	359.159,70	1,91 %	5.078.582,52	27,03 %	0,00	0,00	359.159,70	5.078.582,52		

Eng Fiscal Ageto/sop/dfmpo Engº Civil Fernanda de Silva O. Glória Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino jr
 Gerente de Medição de Obras Públicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas

AGETO
 Fls 1224
 Bto





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento **2025/38969/045461** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	14/08/2025 10:34:11 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	14/08/2025 10:00:53 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	14/08/2025 09:39:51 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	13/08/2025 12:23:24 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AGETO
Fis 026
B/w

FOTOGRAFICO RELATÓRIO


CONTRATO:00022/2024


**OBRA : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO**

VISITA : 05/08/2025 REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO


LOCAL : PALMAS

EMPRESA : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA




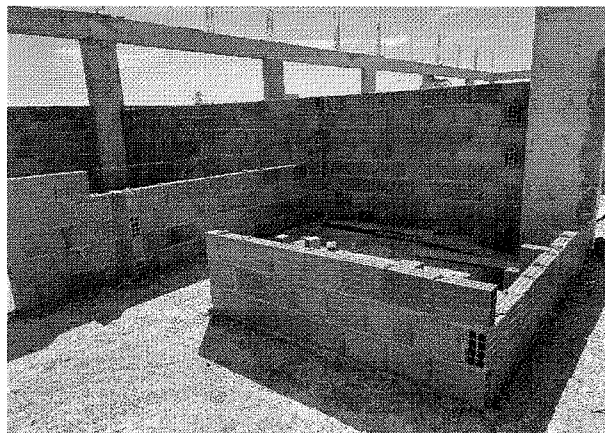


=> VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

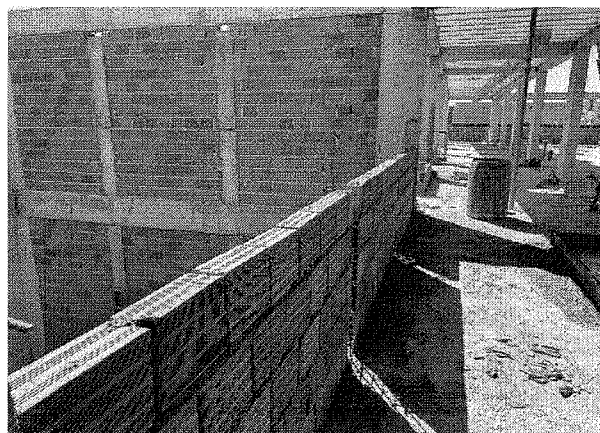



=> VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

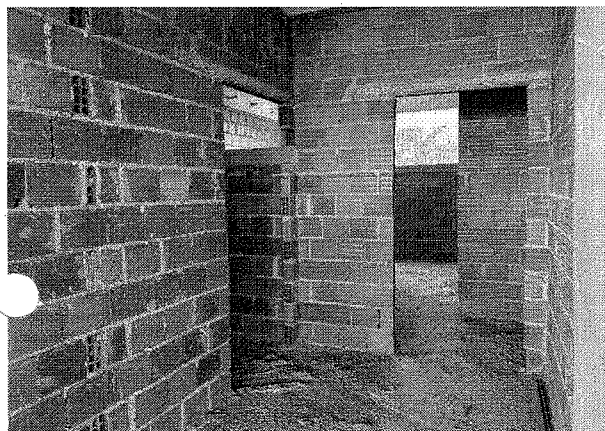

=> VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

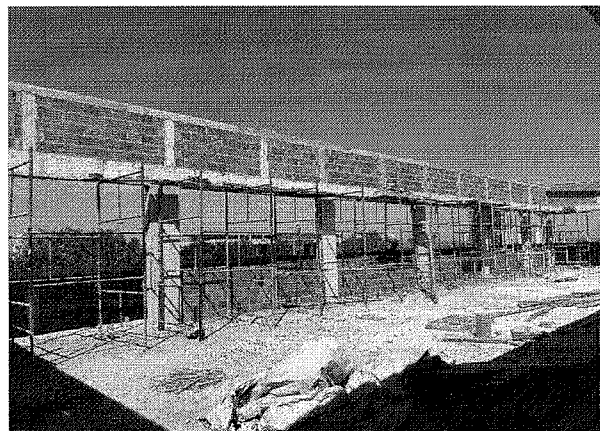


=> VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS

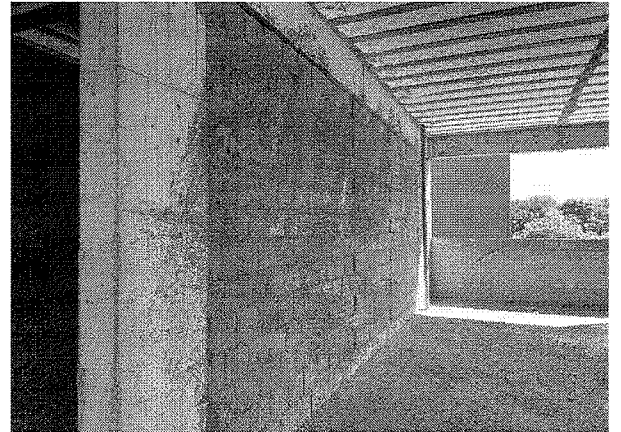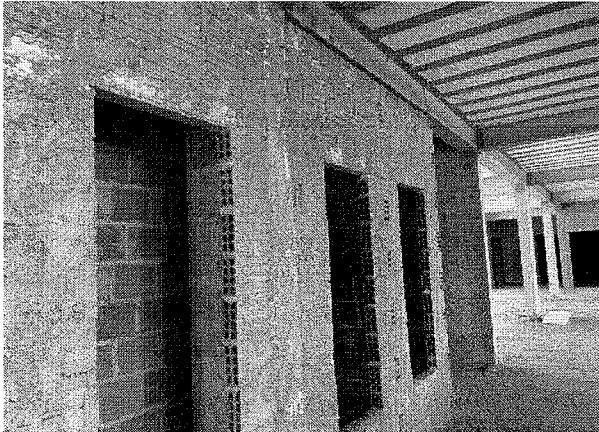


=> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS

=> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS

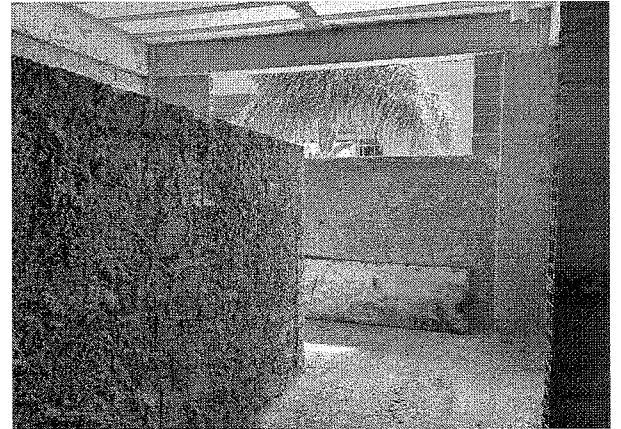


=> MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA


=> EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

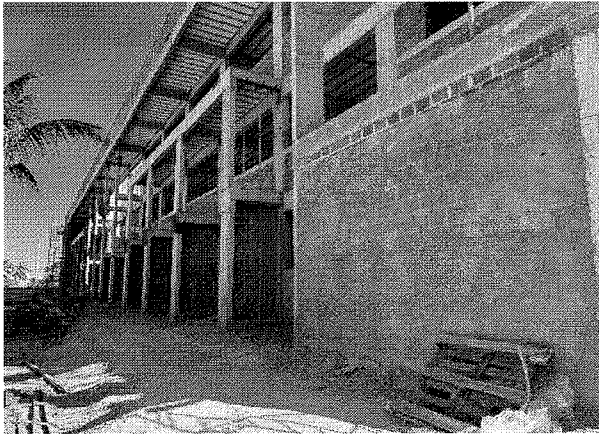


=> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA

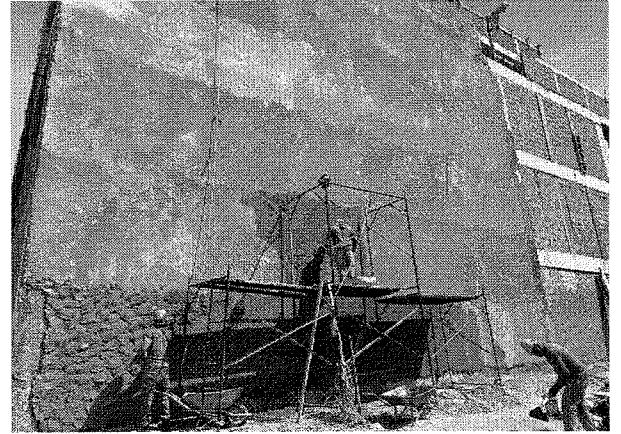



=> EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA

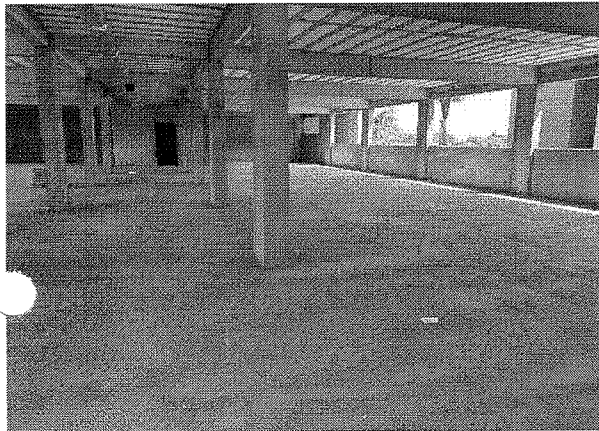

=> CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM

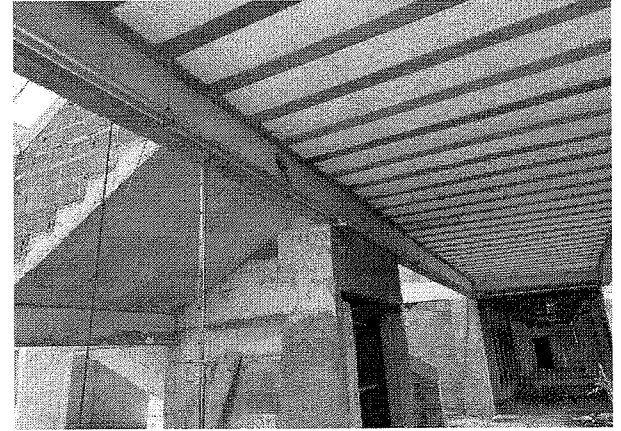


=> SISTEMA DE HIDRANTES

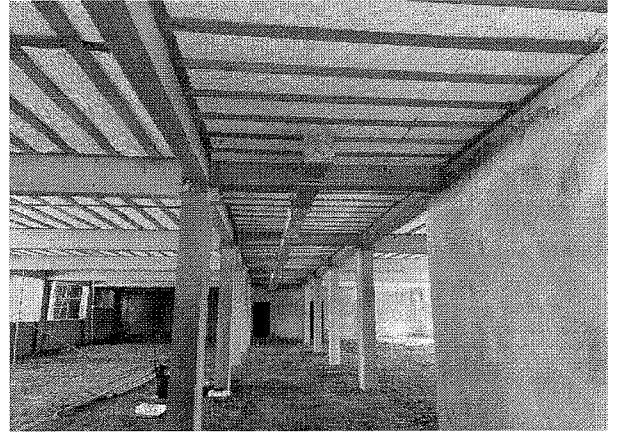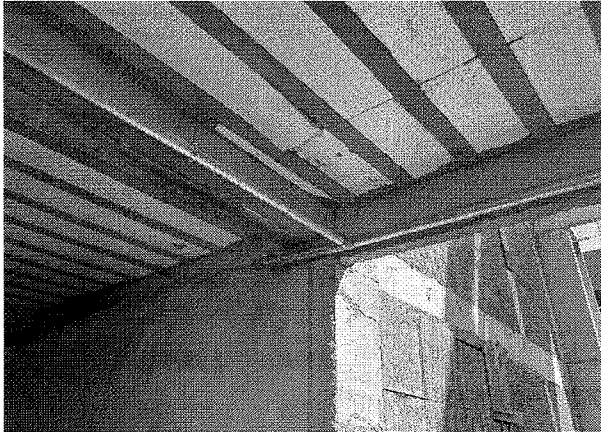

=> SISTEMA DE HIDRANTES



=> SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA E RENOVAÇÃO DE AR

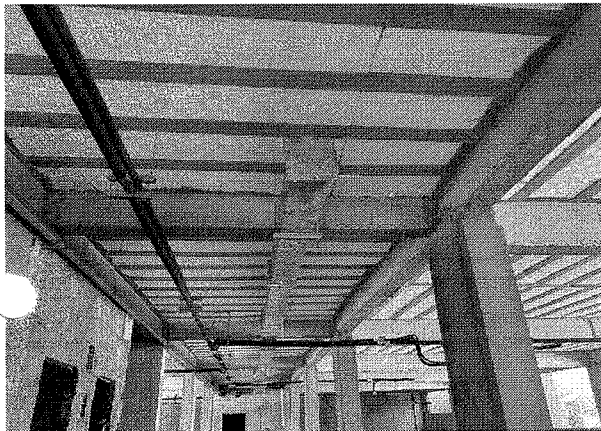

=> SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA E RENOVAÇÃO DE AR
E SISTEMA DE AR CONDICIONADO

=> SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA E RENOVAÇÃO DE AR

AGETO
Fis 1231
Ab6

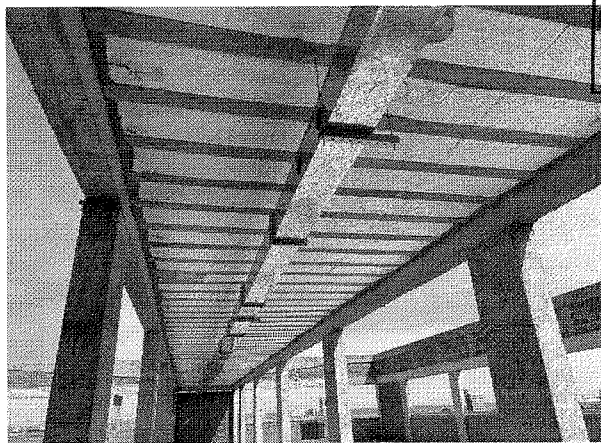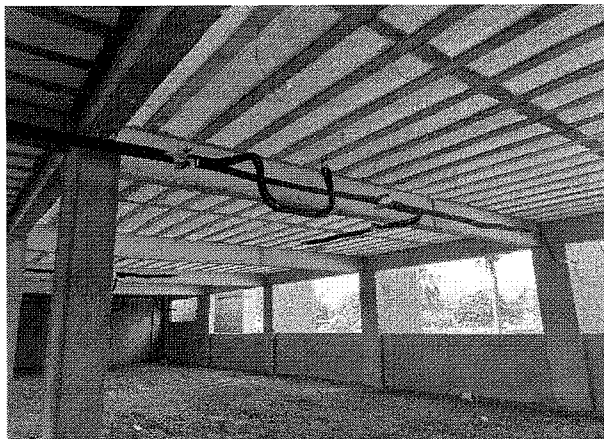


=> SISTEMA DE AR CONDICIONADO

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA E RENOVAÇÃO DE AR



Govorno do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)



Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOURO-COTA / 00 / 00
Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA Data assinatura: 28/05/2024
Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024 Data Licitação: 05/04/2024
Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL
Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	: 18.786.000,00	
Aditivos	: 0,00	
Valor Total a PI	: 18.786.000,00	
Valor Medido a PI	: 5.078.582,52	27,03%
Valor Medido Reajustamento	: 0,00	
Valor Total Faturado	: 5.078.582,52	
Saldo do Contrato	: 13.707.417,48	72,97%
ma Medição	: 10ª - Parcial	
Período da Última Medição	: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Situação	: Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	: 24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	: 28/05/2024
Prazo Execução Contratual	: 549	Prazo de Vigência	: 731
Venc. do Prazo de Execução	: 24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	: 28/05/2026





MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
25/08/2025 17:41:04	08/2025	Palmas - TO
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Palmas	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaua@acaua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

AGETO
Fls 1233
Bto

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 107.747,91

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 251.411,79

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 359.159,70

Atesto que os SERVIÇOS/MATERIAIS descritos neste documento, foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Destinados à pagamento da 10ª medição da obra nº 022/2024 do prédio Anexo da Assembleia Legislativa.

Em 28/08/25

*Antonio Lopes Braga Júnior
Diretor de Ass. Administrativa*

DADOS PARA PAGAMENTO:

NCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	4.309,92	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
359.159,70	107.747,91	0,00	251.411,79	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	12.570,59	0,00	342.279,19	359.159,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 48.306,98 Federal e R\$ 17.957,98 Municipal. Fonte: IBPT [81AAFF]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra:

2403 - ART: TO20240504592

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 1721000120449007900013725000000003625080313523908

Visualizado em: 25/08/2025 17:41:04

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.



Contrato nº 22/2024

PROCESSO: 2024/3096/00628

ASSUNTO: MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0022/2024 – OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

INTERESSADO: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

ATESTO

ATESTO à nota fiscal nº 036/2025, no valor de R\$ 359.159,70 (Trezentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Referente à 10ª Medição Parcial da Execução da Construção do Prédio Anexo da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins no município de Palmas - TO. A Nota Fiscal foi satisfatoriamente recebida e o seu valor está de acordo.

Palmas – TO, 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
André Luiz Costa Lima
Matrícula: 11684976-4
Fiscal de Obra.
