



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
 Secretário
 NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 11ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S): PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 5.951.005,99 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil e cinco reais e noventa e nove centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 11ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 692.582,46 (seiscentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos).
 Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	5.771.164,98
Total dos Reajustamentos -----	R\$	179.841,01
Valor Global Atual -----	R\$	5.951.005,99
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	5.258.423,53
Saldo desta a pagar -----	R\$	692.582,46

Palmas - TO, 25 de setembro de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Antonio Trabulsi Sobrinho
 Presidente - Interveniente

Amélio Cayres de Almeida
 Presidente da Assembléia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 30/09/2025 19:07:48

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 25/09/2025 18:12:35

EXISTEM MAIS 3 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 2C52B5270226B523 | SGD:2025/38969/053334



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatório de aprovação.pdf do documento 2025/38969/053334 foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	30/09/2025 19:07:48 Assinado por LOGIN E SENHA por: Antonio Trabulsi Sobrinho
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	25/09/2025 16:12:35 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	25/09/2025 11:11:38 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	25/09/2025 11:05:43 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	25/09/2025 11:04:10 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



MEDIÇÃO DA 11ª PARCELA

Contrato: 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** **Processo:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 25/09/2025 **Período de Avaliação:** 01/08/2025 a 30/08/2025
Nº da Parcela: 011 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS **Rodovia:**

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual
01.00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01.01.000	PROJETOS								
01.02.000	LICENCIAMENTO								
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	7,68925	0,00000	7,68925	7,205,81510	55,407,31376	0,00000	55,407,31376
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	6,45491	0,00000	6,45491	910,20820	5,875,31201	0,00000	5,875,31201
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	29,15261	0,00000	29,15261	35,991,15030	1,049,235,96815	0,00000	1,049,235,96815
01.03.007	ALVENARIAS	%	3,37065	0,00000	3,37065	10,239,84260	34,514,92546	0,00000	34,514,92546
SubTotal Sub item.....							1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
SubTotal Item.....							1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
Total Parcial.....							1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938

AGETC
 Fis 1249
 186

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 25/09/2025 16:12:36
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 25/09/2025 11:11:38
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 8020E56D0226B71C | SGD:202538969/053337





MEDIÇÃO DA 11ª PARCELA

Contrato: 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 25/09/2025 **Período de Avaliação:** 01/08/2025 a 30/08/2025
Nº da Parcela: 011 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS **Rodovia:**

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual
01.00.000	PLMILHA APROVADA	%	100,00000	0,00000	100,00000	5.856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO	%	20,96000	3,54000	24,50000	9.082,94830	190.378,58637	32.153,63698	222.532,23335
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	90,00002	0,00000	90,00002	587,53250	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.675,77830	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00000	0,00000	100,00000	24.614,41130	1.412.205,08096	0,00000	1.412.205,08096
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	57,37310	40,46463	97,83773	9.598,30560	367.148,09703	21.284,25233	388.432,34936
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	38,24736	2,21727	40,46463	5.992,16562	0,00000	158.184,06428	158.184,06428
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	0,00000	26,39848	26,39848	2.388,19990	0,00000	0,00000	21.251,68339
01.01.008	COBERTURA	%	8,89862	0,00000	8,89862	42.189,19080	220.699,25113	421.738,33935	642.437,59047
01.01.009	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	5,23118	9,99636	15,22754	1.090,53370	16.463,55826	9.496,40018	25.959,95843
01.01.010	REVESTIMENTOS	%	15,09679	8,70803	23,80482	21.544,68250	76.623,01697	49.725,77355	126.348,79052
01.01.011	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	3,55647	2,30803	5,86450	6.005,07440	300,253,72000	0,00000	300,253,72000
01.01.012	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%	50,00000	0,00000	50,00000				
01.01.013	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%							
SubTotal Sub Item.....									
SubTotal Item.....									
							3.933.549,04086	692.582,46666	4.626.131,50752
							3.933.549,04086	692.582,46666	4.626.131,50752

AGETO
 Fls 1250
 M.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 25/09/2025 16:12:36
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 25/09/2025 11:11:38
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATARIOS, NA PAGINA DE ASSINATURA
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 8020E56D0226B71C | SGD:2025/38969/053337



MEDIÇÃO DA 11ª PARCELA

Contrato: 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 25/09/2025 **Período de Avaliação:** 01/08/2025 a 30/08/2025
Nº da Parcela: 011 **Nº da O.S.:** 000220022024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Total Parcela.....	3.933.549,04086	692.582,46666	4.626.131,50752
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência	0.00000	0.00000	0.00000
Total Parcela.....	3.933.549,04086	692.582,46666	4.626.131,50752
Total das Parcelas.....	5.078.582,56024	692.582,46666	5.771.165,02689

Importa o Liquidado a Pagar da medição em R\$ 692.582,46 (seiscentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) Palmas-TO, 25 de setembro de 2025.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 25/09/2025 16:12:36
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 25/09/2025 11:11:38
 EXISTEM MAIS 2 SIGNATARIOS. NA PÁGINA DE ASSINATURA
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 8020E56D0226B71C | SGD:2025/98969/053337





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodemedição.pdf do documento **2025/38969/053337** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	25/09/2025 16:12:36 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	25/09/2025 11:11:38 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	25/09/2025 11:05:43 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	25/09/2025 11:03:59 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima

Contrato: 00022/2024 **SubContrato:** 0 **Empresa:** 04.490.079/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA **Processo Medição:** 00628/3096/2024
Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO **Data da Assinatura:** 28/05/2024
Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO. **Valor Contrato:** 18.786.000,00
Valor dos Aditivos: 0,00
Valor Total Contrato: 18.786.000,00
Prazo: 549 Dias
Prorrogações Concedi.: 0 Dias

Medição	Período da Medição	EXECUTADO						TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		PREÇO INICIAL (PI)		REAJUSTE		R\$ Acumulado			
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.		R\$		
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	638.331,24	2.852.207,09
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	111.643,57	2.963.850,66
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	51.593,39	51.593,39	658.274,71	3.622.125,37
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,37	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	37.143,74	88.737,13	473.913,11	4.096.038,48
9 a	01/06/2025 a 30/06/2025	712.121,47	3,79 %	4.719.422,82	25,12 %	60.560,23	149.297,36	772.681,70	4.868.720,18
10 a	01/07/2025 a 31/07/2025	359.159,70	1,91 %	5.078.582,52	27,03 %	30.543,65	179.841,01	389.703,35	5.258.423,53
11 a	01/08/2025 a 30/08/2025	692.582,46	3,68 %	5.771.164,98	30,72 %	58.898,59	238.739,60	751.481,05	6.009.904,58

Eng Fiscal Ageto/sop/dfimpop Engº Civil Fernanda di Silva O. Glória Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Gerente de Medição de Obras Publicas Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Publicas Superintendente de Obras Publicas





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatóriodefaturamento.pdf do documento **2025/38969/053337** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	25/09/2025 16:12:36 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	25/09/2025 11:11:38 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
FERNANDA DI SILVA OLIVEIRA GLORIA	25/09/2025 11:05:43 Assinado por LOGIN E SENHA por: Fernanda di silva oliveira gloria
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	25/09/2025 11:03:59 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



FOTOGRAFICO RELATÓRIO

CONTRATO:00022/2024



OBRA : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

VISITA : 08/09/2025 REFERENTE À 11ª MEDIÇÃO

LOCAL : PALMAS


EMPRESA : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA



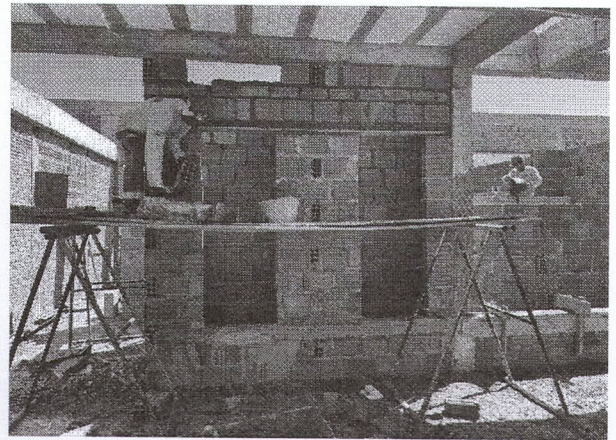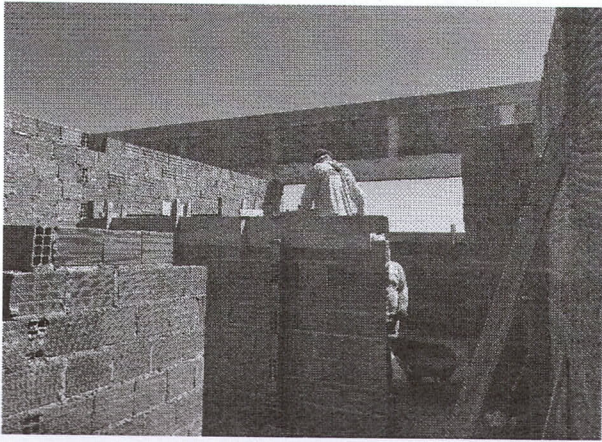

=> ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM



=> ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

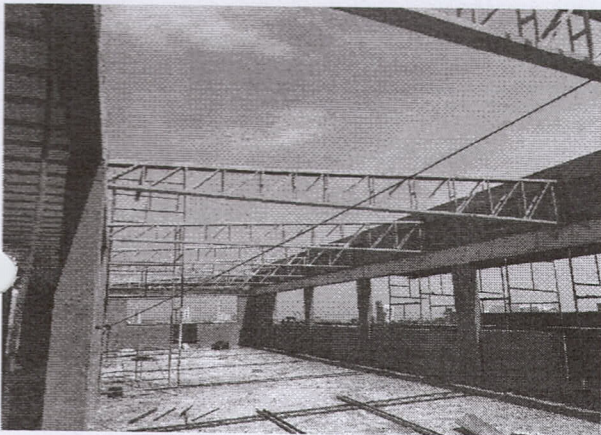

=> Estrutura metálica p cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)



=> Estrutura metálica p cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)



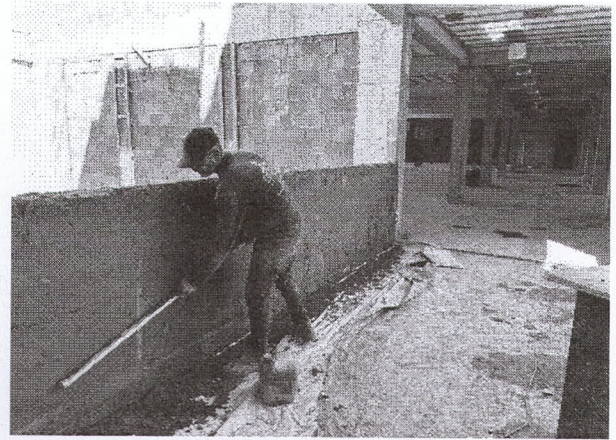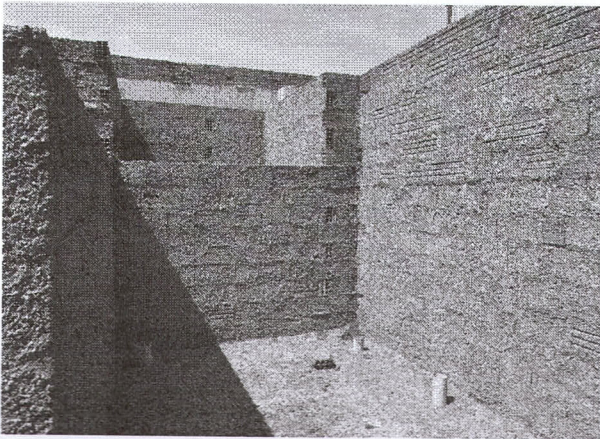

=> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS


=> MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

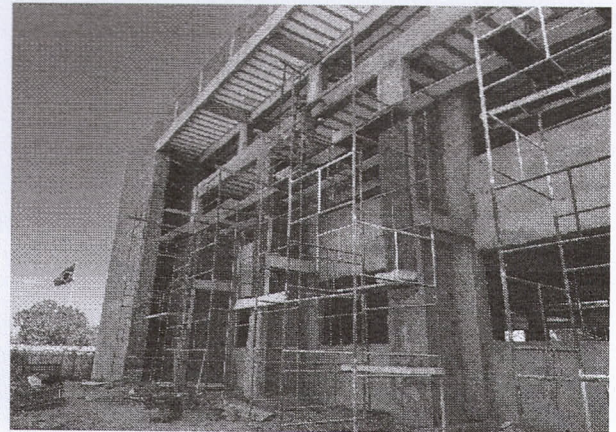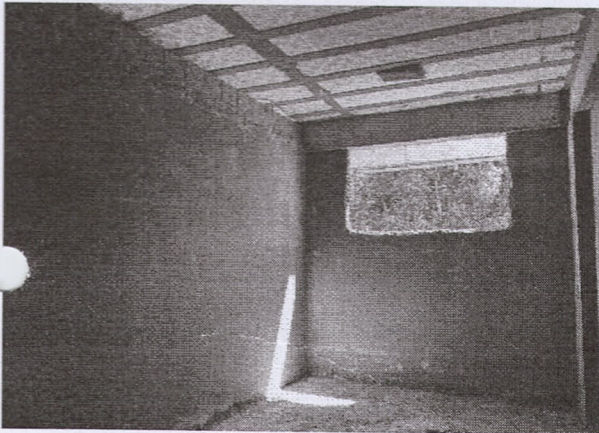

=> EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES



=> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO



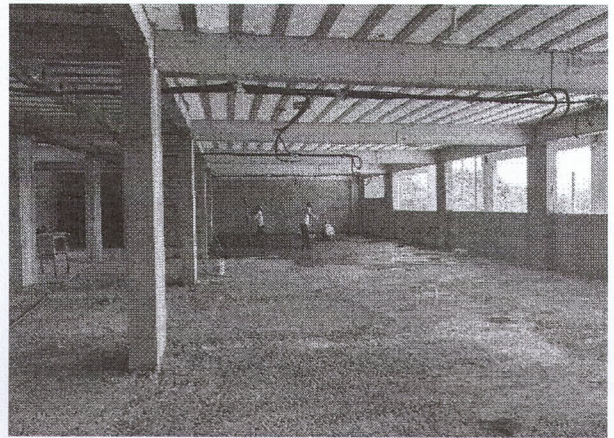

=> EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA



=> CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE

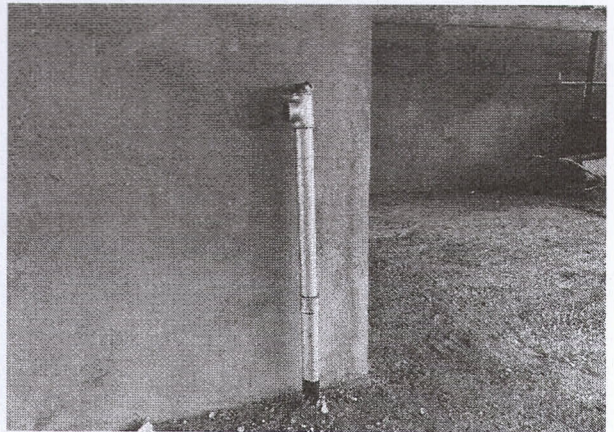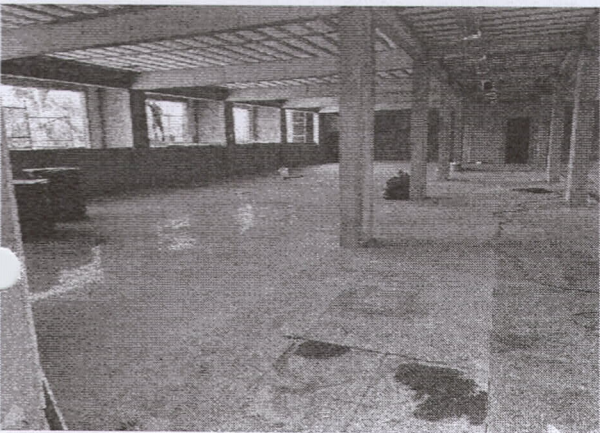

=> PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS

=> SISTEMA DE HIDRANTES



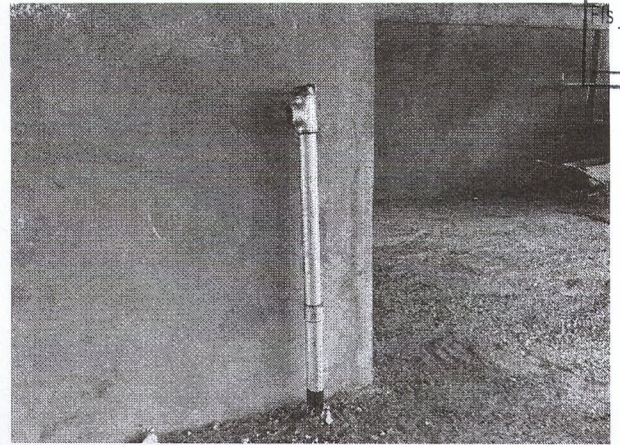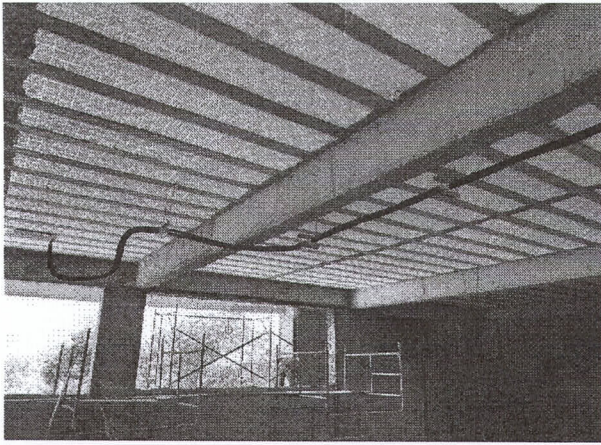

AGETO

↓ 259

13/6

=> SISTEMA DE AR CONDICIONADO

SISTEMA DE HIDRANTES





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)

AGETO

Fis 1260

136

Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOURO-COTA / 00 / 00
Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA Data assinatura: 28/05/2024
Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024 Data Licitação: 05/04/2024
Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL
Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	: 18.786.000,00	
Aditivos	: 0,00	
Valor Total a PI	: 18.786.000,00	
Valor Medido a PI	: 5.771.164,98	30,72%
Valor Medido Reajustamento	: 238.739,60	
Valor Total Faturado	: 6.009.904,58	
Saldo do Contrato	: 13.014.835,02	69,28%
Última Medição	: 11ª - Parcial	
Período da Última Medição	: 01/08/2025 a 30/08/2025	
Situação	: Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	: 24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	: 28/05/2024
Prazo Execução Contratual	: 549	Prazo de Vigência	: 731
Venc. do Prazo de Execução	: 24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	: 28/05/2026





MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
01/10/2025 10:42:12
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
10/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaua@acaua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11* MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA N° 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO N° 90.021.02664/75 - ART N° TO20240504592

PROCESSO N°: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO N°: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 207.774,74

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 484.807,72

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 692.582,46

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

Atesto que os SERVIÇOS/MATERIAIS descritos neste documento, foram executados e/ou recebidos atendendo às especificações.

Destinados à pponto da 11ª
medição de construção do
prédio Anexo do ALETO

Em 02/10/25

Antônio Lopes Braga Júnior
Diretor de Área Administrativa

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	8.310,99	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
692.582,46	207.774,74	0,00	484.807,72	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	24.240,39	0,00	660.031,08	692.582,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 93.152,34 Federal e R\$ 34.629,12 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra:

2403 - ART: TO20240504592

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17210001204490079000137250000000003925100318339420

Visualizado em: 01/10/2025 10:42:13

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.



Contrato nº 22/2024

PROCESSO: 2024/3096/00628
ASSUNTO: MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0022/2024 – OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.
INTERESSADO: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

ATESTO

ATESTO à nota fiscal nº 039/2025, no valor de R\$ 692.582,46 (Novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos). Referente à 11ª Medição Parcial da Execução da Construção do Prédio Anexo da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins no município de Palmas - TO. A Nota Fiscal foi satisfatoriamente recebida e o seu valor está de acordo.

Palmas – TO, 01 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
André Luiz Costa Lima
Matrícula: 11684976-4
Fiscal de Obra.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77001-970 – Palmas/TO | (63) 3218-7101/7104
E-mail: gabpres@ageto.to.gov.br

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 01/10/2025 12:43:05

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4F9886AF02282650 | SGD:2025/38969/054341

