



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário
NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 14ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S): PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 10.892.352,53 (dez milhões, oitocentos e noventa e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 14ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 1.542.304,81 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil e trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	10.391.823,58
Total dos Reajustamentos -----	R\$	500.528,95
Valor Global Atual -----	R\$	10.892.352,53
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	9.350.047,72
Saldo desta a pagar -----	R\$	1.542.304,81

Palmas - TO, 16 de dezembro de 2025

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

TÚLIO PARREIRA LABRE
Vice-Presidente Executivo Respondendo
Interinamente - Ato nº 3.312 - DSG, de 15 de
dezembro de 2025 (DOE 6.961 de 15/12/2025)

Amélio Cayres
Presidente
Amélio Cayres de Almeida
Presidente da Assembléia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 19/12/2025 09:59:18

de Tec ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 16/12/2025 15:50:48

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A32370C1023A49E0 | SGD:2025/38969/066498





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatório de aprovação.pdf do documento **2025/38969/066498** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
TÚLIO PARREIRA LABRE	19/12/2025 09:59:18 Assinado por LOGIN E SENHA por: Túlio Parreira Labre
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	16/12/2025 15:50:48 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	16/12/2025 12:37:02 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA	16/12/2025 12:29:57 Assinado por LOGIN E SENHA por: André Luiz Costa Lima



Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 14ª PARCELA

Contrato: 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 11/12/2025 **Período de Avaliação:** 01/11/2025 a 30/11/2025
Nº da Parcela: 014 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS **Rodovia:**

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS								
01.01.000	PROJETOS								
01.02.000	LICENCIAMENTO								
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL								
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	7,68925	0,00000	7,68925	7,203,81510	55,407,31376	0,00000	55,407,31376
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	6,45491	0,00000	6,45491	910,20823	5,875,31291	0,00000	5,875,31291
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	29,15261	0,00000	29,15261	35,991,15039	1,049,235,96815	0,00000	1,049,235,96815
01.03.007	ALVENARIAS	%	3,37065	0,00000	3,37065	10,239,64269	34,514,92546	0,00000	34,514,92546
	SubTotal Sub Item.....						1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
	SubTotal Item.....						1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
	Total Parcela.....						1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938
	Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência						0,00000	0,00000	0,00000
	Total Parcela.....						1,145,033,51938	0,00000	1,145,033,51938

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 16/12/2025 15:50:48
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 16/12/2025 12:37:02
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:57
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: 9E065F63023A4A2E | SGD:2025/38969/066500





MEDIÇÃO DA 14ª PARCELA

Contrato: 000222024 Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Depto Executor: 1 Processo: 0132038962023 Processo Medição: 0062830962024

SubContrato: 0 Data da Parcela: 11/12/2025 Período de Avaliação: 01/11/2025 a 30/11/2025

Nº da Parcela: 014 Nº da O.S.: 000220012024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS Rodovia:

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual
01.00.000	PLANILHA APROVADA	%	100,00000	0,00000	100,00000	5.856,94340	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO	%	40,98000	3,77000	44,75000	9.062,94830	372.219,22133	34.242,71509	406.461,93642
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.223,75930	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	90,00002	0,00000	90,00002	587,53250	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00000	3.675,77630	367.577,63000	0,00000	367.577,63000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	57,37310	0,00000	57,37310	24.614,41130	1.412.205,08096	0,00000	1.412.205,08096
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	40,46463	16,85063	57,31526	9.599,30560	388.432,34936	161.754,34692	550.186,69628
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	0,00000	4,20396	4,20396	5.161,48737	0,00000	21.698,68644	21.698,68644
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	97,21059	0,00000	97,21059	5.992,16562	582.501,95530	0,00000	582.501,95530
01.01.008	FORRO	%	62,81563	26,39659	89,21222	2.368,19990	150.016,28128	63.040,33360	213.056,61488
01.01.009	COBERTURA	%	0,00000	36,62131	36,62131	18.344,92110	0,00000	671.815,04253	671.815,04253
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	52,53749	9,98966	62,52715	42.189,19080	2.216.514,18976	421.455,67177	2.637.969,86153
01.01.011	ESQUADRIAS	%	3,18163	1,00845	4,19008	7.362,26440	23.424,00128	7.424,47553	30.848,47682
01.01.012	REVESTIMENTOS	%	47,86673	10,66680	58,53353	1.105,17080	52.889,86058	11.788,63589	64.678,49647
01.01.013	PINTURA	%	13,16174	24,97233	38,13407	749,52160	9.865,00842	18.717,30074	28.582,30916
01.01.014	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	7,55654	12,51642	20,07296	2.203,20660	16.648,61880	27.576,25915	44.224,87795
01.01.015	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	28,69166	0,00000	28,69166	1.090,53370	31.289,22214	0,00000	31.289,22214
01.01.016	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	%	0,00000	13,09510	13,09510	7.849,60390	0,00000	102.791,34803	102.791,34803
01.01.017	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	0,00000	0,00000	0,00000	21.544,88250	819.699,76274	0,00000	819.699,76274
01.01.018	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	0,00000	0,00000	0,00000				
01.01.019	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	0,00000	0,00000	0,00000				
01.01.020	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%	0,00000	0,00000	0,00000				





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 14ª PARCELA

Contrato: 000222024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAJÁ LTDA**
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 0132038962023 **Processo:** 0132038962023 **Processo Medição:** 0062830962024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 11/12/2025 **Período de Avaliação:** 01/11/2025 **a** 30/11/2025
Nº da Parcela: 014 **Nº da O.S.:** 000220022024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS **Rodovia:**

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Realizada no Período	Qtde. Acum. Atual	Preço Unitário	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.01.025	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	50,00000	0,00000	50,00000	6,005,07440	300.253,72000	0,00000	300.253,72000
SubTotal Sub Item.....							7.704.485,30874	1.542.304,81570	9.246.790,12441
SubTotal Item.....							7.704.485,30874	1.542.304,81570	9.246.790,12441
Total Parcial.....							7.704.485,30874	1.542.304,81570	9.246.790,12441
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							7.704.485,30874	1.542.304,81570	9.246.790,12441
Total das Parcelas.....							8.849.518,82868	1.542.304,81570	10.391.823,64378

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 1.542.304,81 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil e trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos) Palmas-TO, 12 de dezembro de 2025.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 16/12/2025 15:50:48
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 16/12/2025 12:37:02
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:57
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: 9E065F63023A4A2E | SGP:2025/38969/066500





Contrato: 00022/2024 **SubContrato:** 0 **Empresa:** 04.490.079/0001-37 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** **Processo Medição:** 00628/3096/2024
Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO **Data da Assinatura:** 28/05/2024
Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO. **Valor Contrato:** 18.786.000,00
Valor dos Aditivos: 0,00
Valor Total Contrato: 18.786.000,00
Prazo: 549 Dias
Prorrogações Conced.: 0 Dias

Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)				EXECUTADO			TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	REAJUSTE	R\$ Acumulado		
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67	
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72	
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15	
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85	
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	638.331,24	2.852.207,09	
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	111.643,57	2.963.850,66	
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	51.593,39	51.593,39	658.274,71	3.622.125,37	
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,37	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	37.143,74	88.737,13	473.913,11	4.096.038,48	
9 a	01/06/2025 a 30/06/2025	712.121,47	3,79 %	4.719.422,82	25,12 %	60.560,23	149.297,36	772.681,70	4.868.720,18	
10 a	01/07/2025 a 31/07/2025	359.159,70	1,91 %	5.078.582,52	27,03 %	30.543,65	179.841,01	389.703,35	5.258.423,53	
11 a	01/08/2025 a 30/08/2025	692.582,46	3,68 %	5.771.164,98	30,72 %	58.898,59	238.739,60	751.481,05	6.009.904,58	
12 a	01/09/2025 a 30/09/2025	1.496.399,98	7,96 %	7.267.564,96	38,68 %	127.256,84	365.996,44	1.623.656,82	7.633.561,40	
13 a	01/10/2025 a 31/10/2025	1.581.953,81	8,42 %	8.849.518,77	47,10 %	134.532,51	500.528,95	1.716.486,32	9.350.047,72	
14 a	01/11/2025 a 30/11/2025	1.542.304,81	8,20 %	10.391.823,58	55,31 %	131.160,68	631.689,63	1.673.465,49	11.023.513,21	

Diretoria de Tecnologia da Informação RL_Faturamento ANDRE LUIZ COST 12/12/2025 Página : 1

Andre Luiz Costa Lima Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Eng Fiscal Ageto/sop/dimop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 16/12/2025 15:50:48
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 16/12/2025 12:37:02
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:57





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

FOTOGRAFICO RELATÓRIO

1º JAN 1989
ESTADO DO TOCANTINS

CONTRATO:00022/2024

OBRA : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

VISITA : 03/12/2025 REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO

LOCAL : PALMAS

EMPRESA : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA




de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

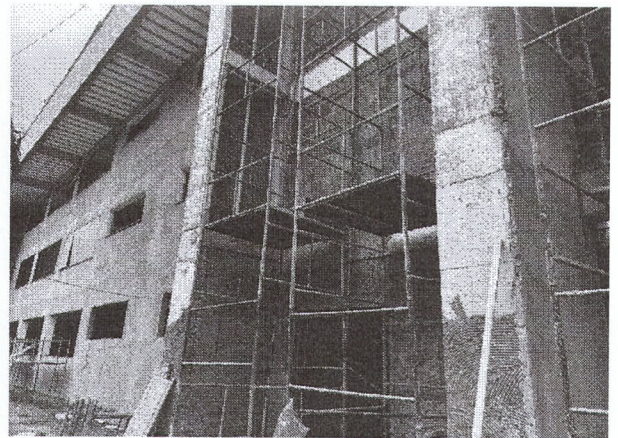

=> ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

=> ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

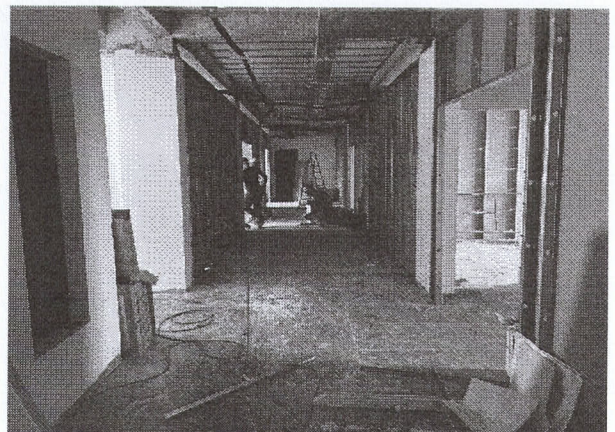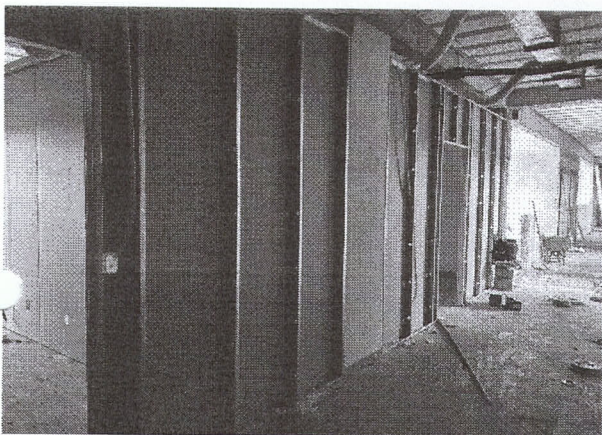

=> PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL

=> PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL




de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58


Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503




GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

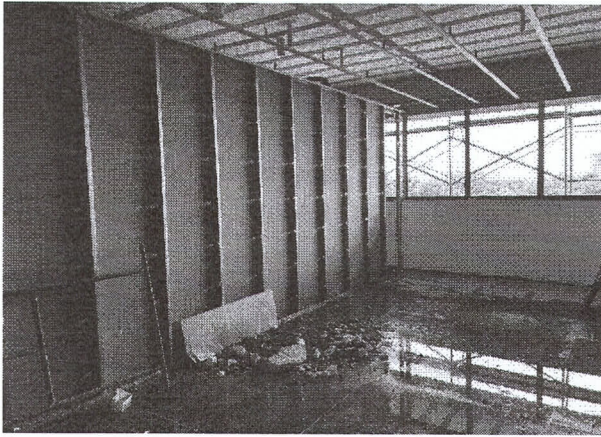


=> PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL

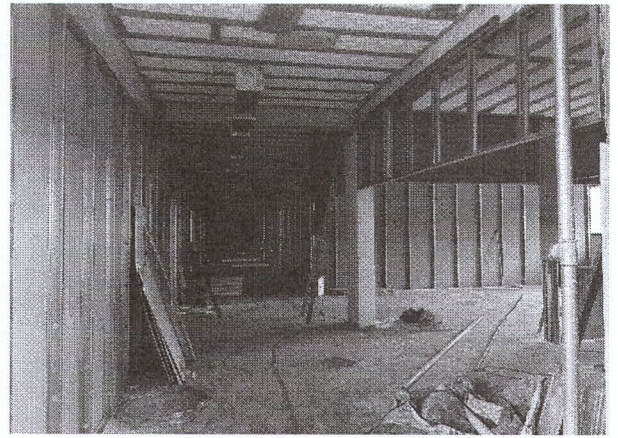

=> PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL

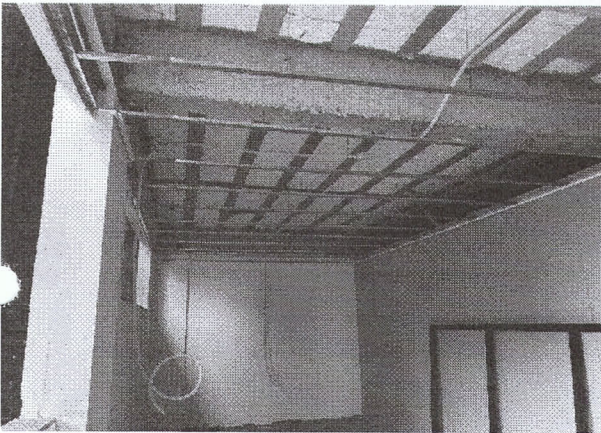

=> ESTRUTURA PARA FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS

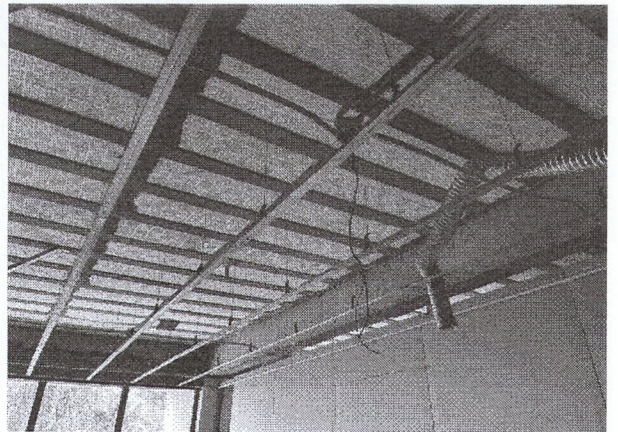

=> ESTRUTURA PARA FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS





de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

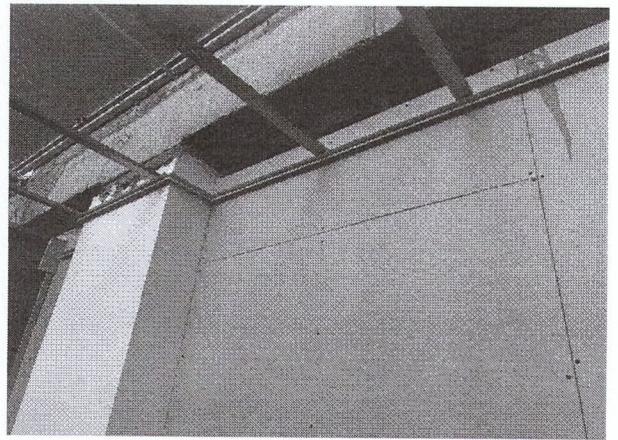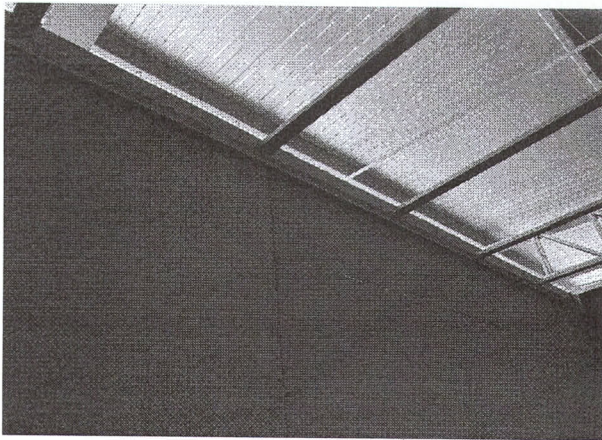

=> ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL)

=> ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL)

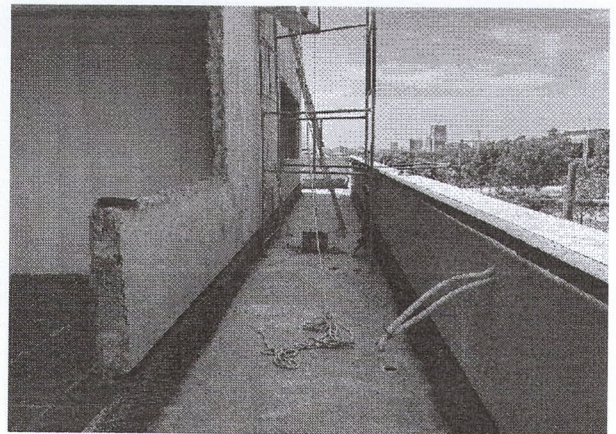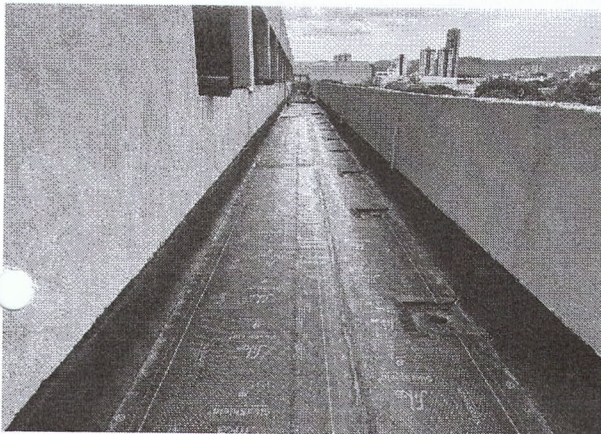

=> IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA

=> PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA





de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A6C | SGD:2025/38969/066503





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

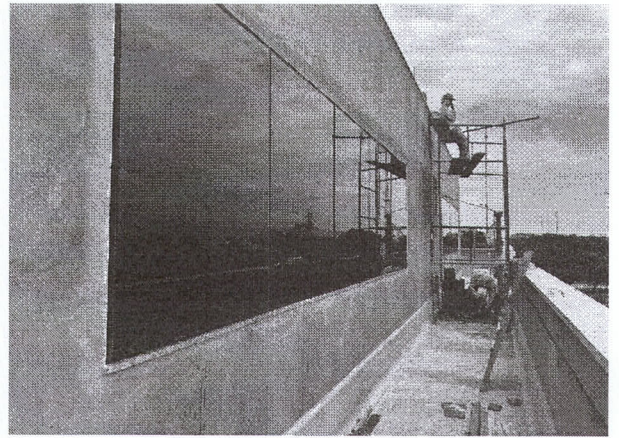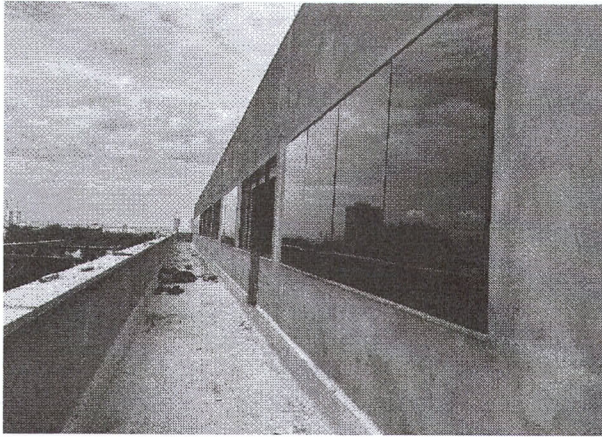

=> FACHADAS - PELE DE VIDRO COBERTURA

=> FACHADAS - PELE DE VIDRO COBERTURA

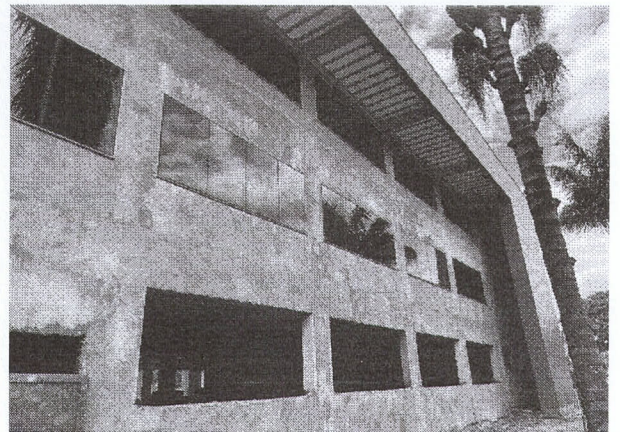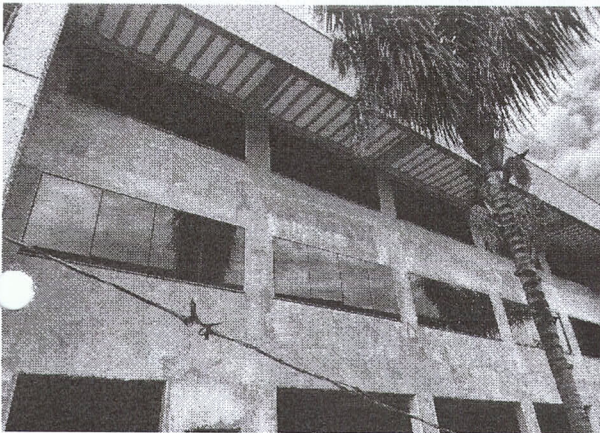

=> FACHADAS - PELE DE VIDRO COBERTURA

=> FACHADAS - PELE DE VIDRO COBERTURA




de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

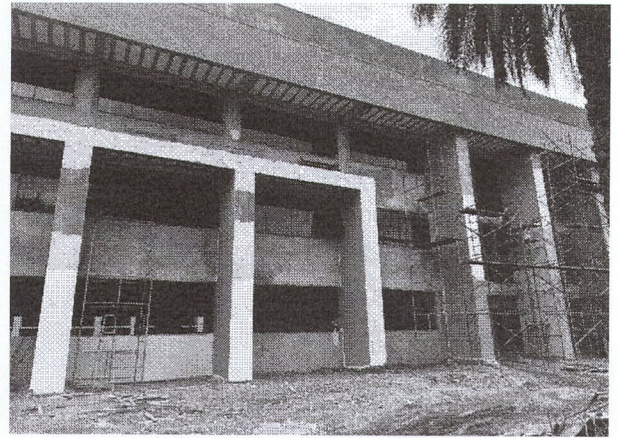

=> FACHADAS - PELE DE VIDRO COBERTURA

=> FACHADAS - PELE DE VIDRO COBERTURA

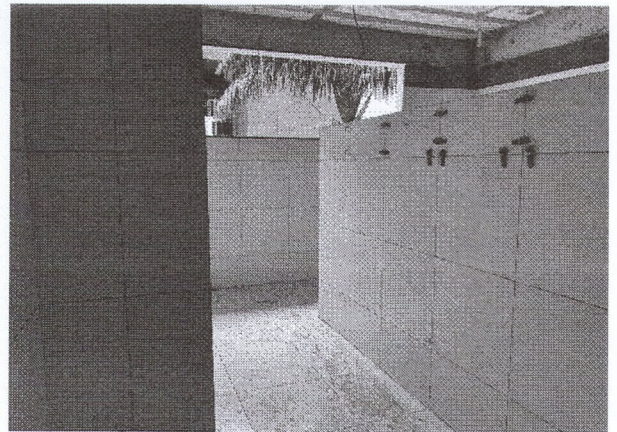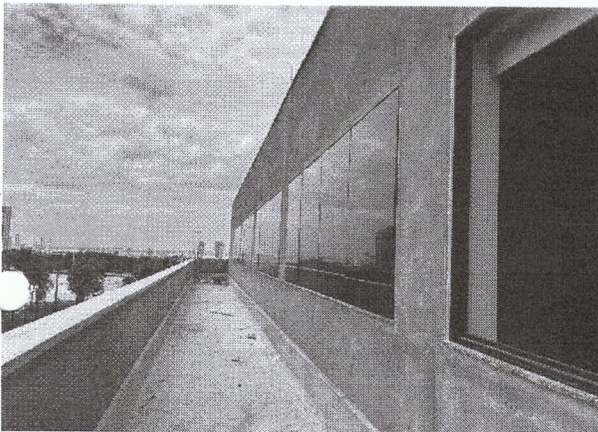

=> FACHADAS - PELE DE VIDRO COBERTURA

=> REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA





de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

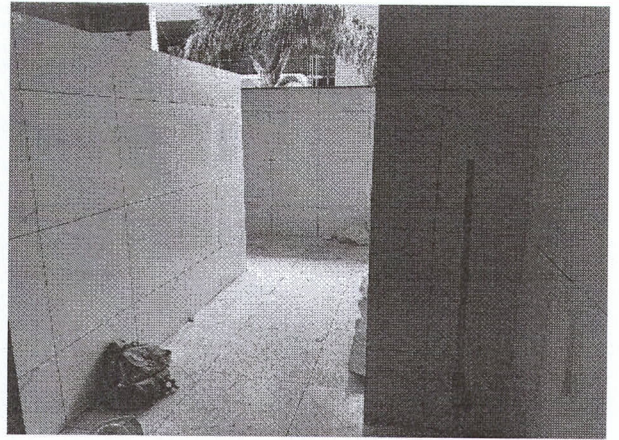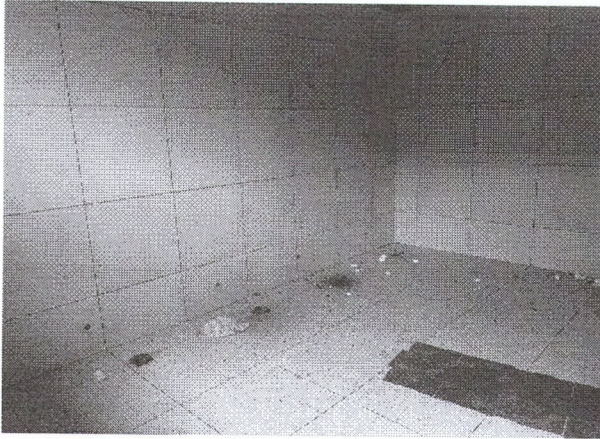

**=> REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA**

**=> REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA**

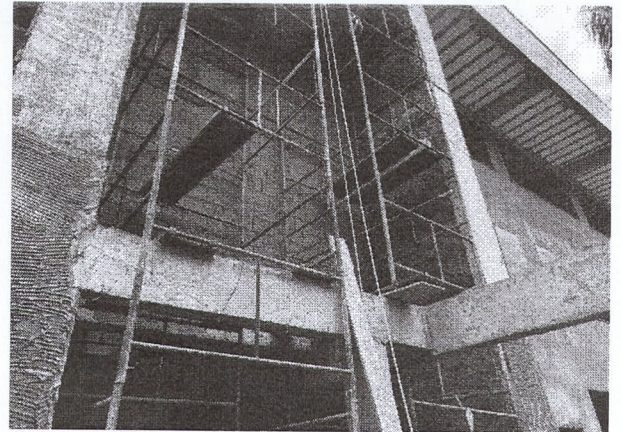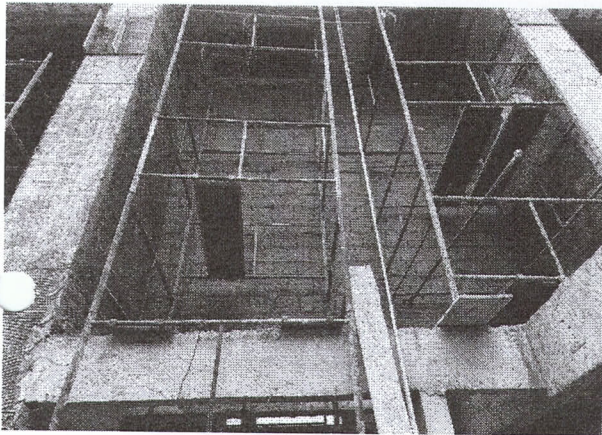

**=> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA**

**=> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA**





de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

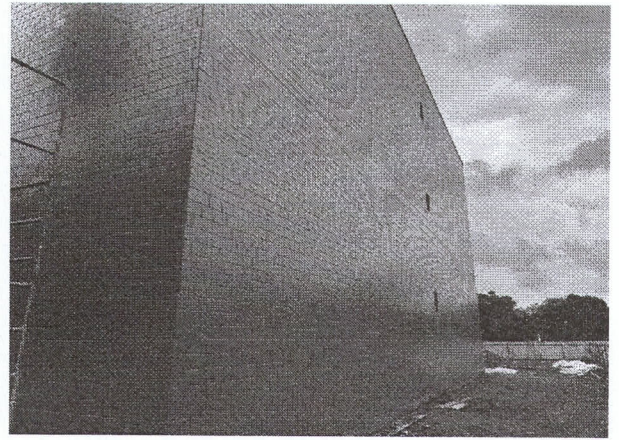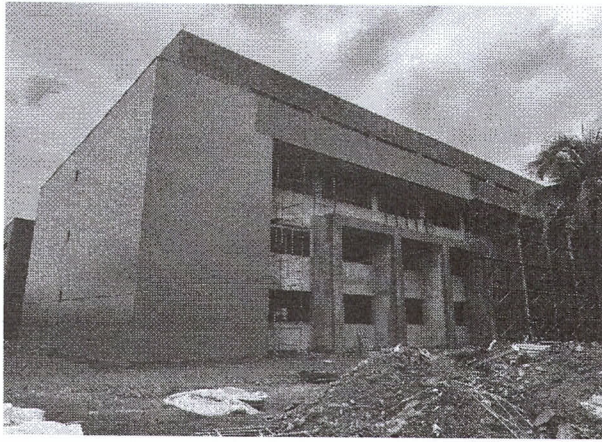

=> REVESTIMENTO COM LITOCERAMICA

=> REVESTIMENTO COM LITOCERAMICA



=> PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS

=> PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS





de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

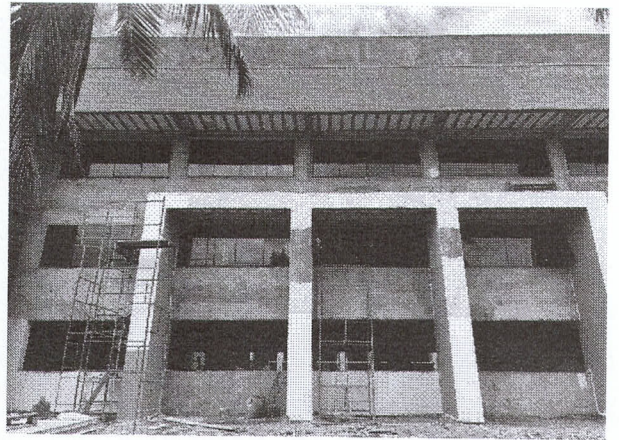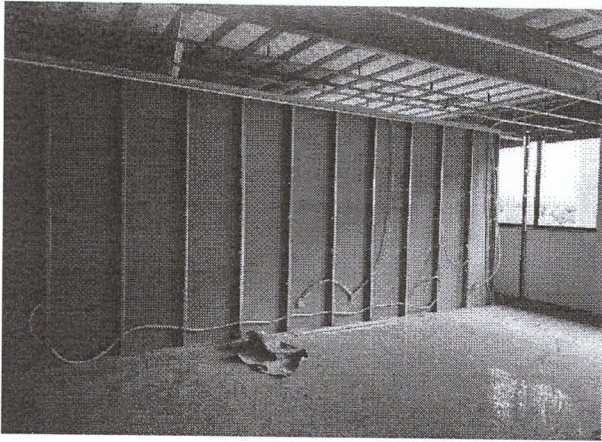

=> PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS

=> PINTURAS PAREDES EXTERNAS



=> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

=> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS




de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503




GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

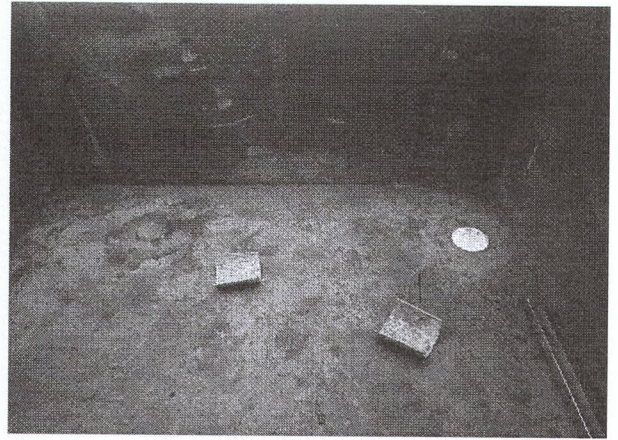

=> **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

=> **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

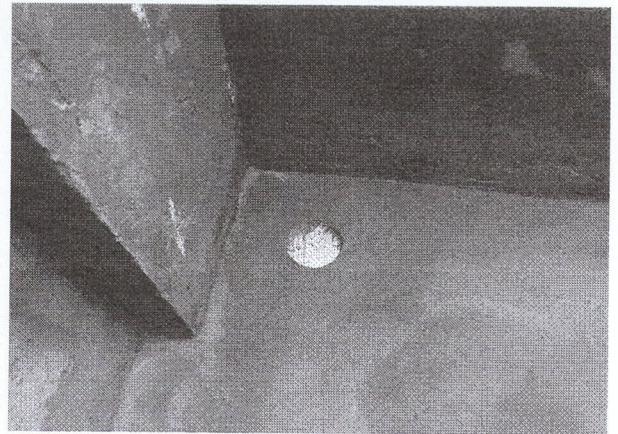

=> **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

=> **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**




de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58


Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503




GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

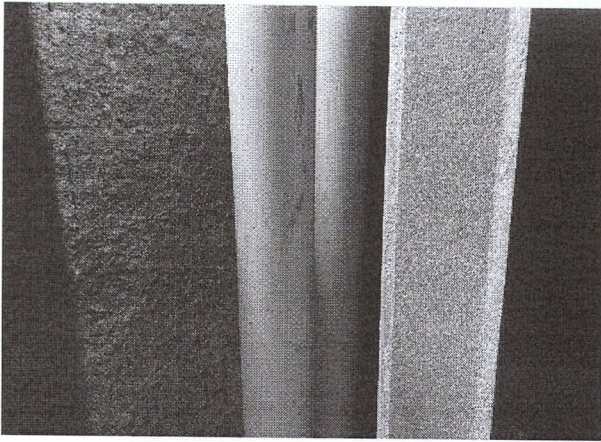

=> DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

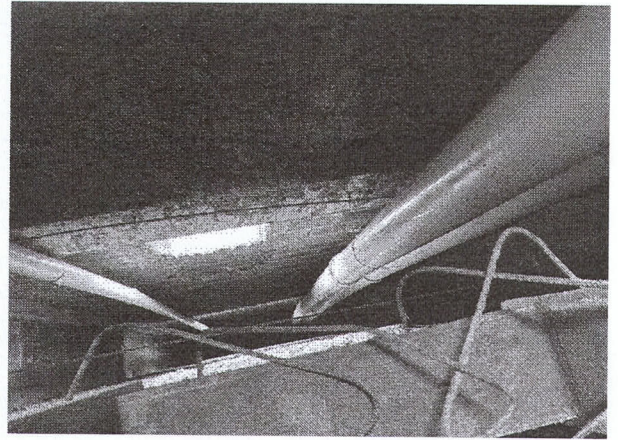

=> DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

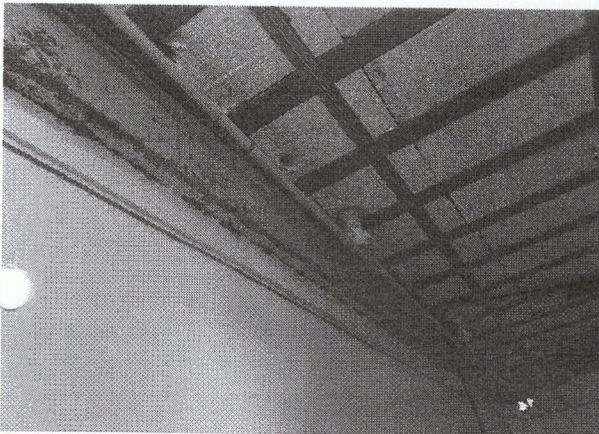

=> DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS



=> DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS




de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

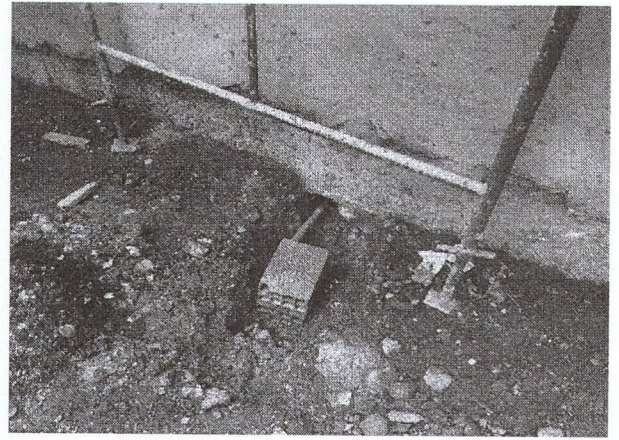

=> DRENAGEM AR CONDICIONADO



=> DRENAGEM AR CONDICIONADO

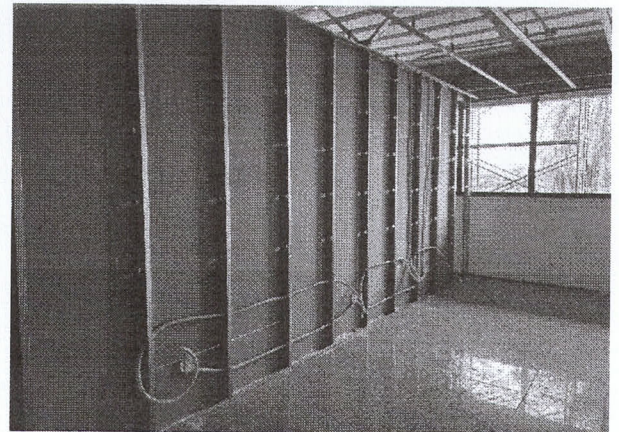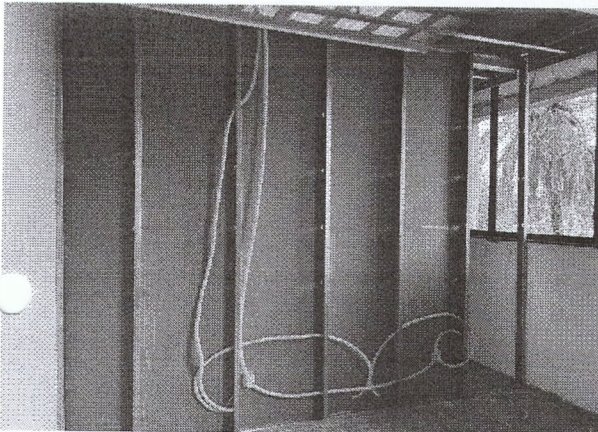

=> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO

=> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO



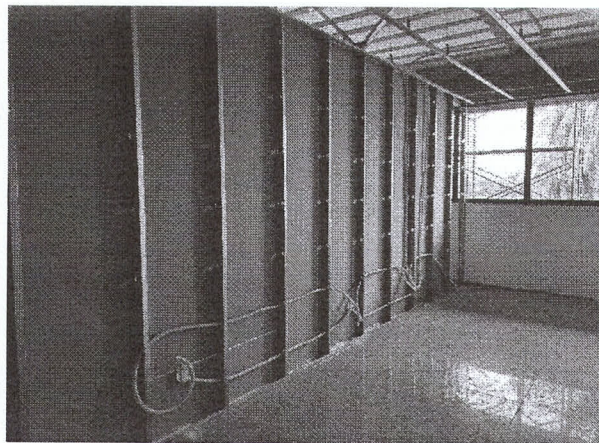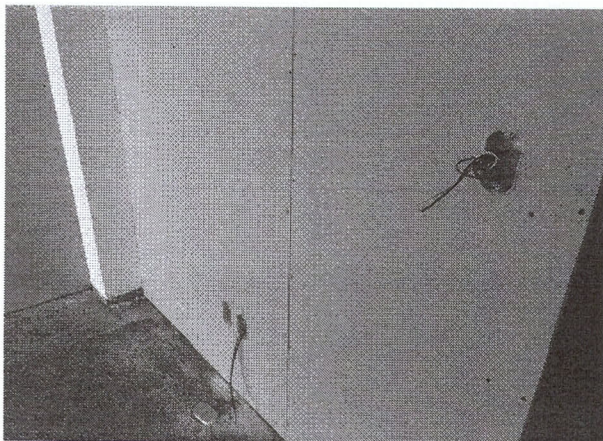

=> **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FIAÇÃO**

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:58

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 65855F3F023A4A8C | SGD:2025/38969/066503



Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)

Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOURO-COTA / 00 / 00
Empresa : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA Data assinatura: 28/05/2024
Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024 Data Licitação: 05/04/2024
Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL
Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s): PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	: 18.786.000,00	
Aditivos	: 0,00	
Valor Total a PI	: 18.786.000,00	
Valor Medido a PI	: 10.391.823,58	55,32%
Valor Medido Reajustamento	: 631.689,63	
Valor Total Faturado	: 11.023.513,21	
Saldo do Contrato	: 8.394.176,42	44,68%
Última Medição	: 14ª - Parcial	
Período da Última Medição	: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Situação	: Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	: 24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	: 28/05/2024
Prazo Execução Contratual	: 549	Prazo de Vigência	: 731
Venc. do Prazo de Execução	: 24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	: 28/05/2026



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: André Luiz Costa Lima EM 16/12/2025 12:29:59

de Tec. Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: B84EC152023A4A8D | SGD:2025/38969/066503



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
19/12/2025 11:46:30
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
12/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

Email

acaua@acaua.com.br

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

STADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

14* MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA N° 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO N° 90.021.02664/75 - ART N° TO20240504592
PROCESSO N°: 2023/38950/001320 - AGETO
PROCESSO N°: 285/2024 - ALETO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL):
MATERIAIS: 30% - R\$ 462.691,44
MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 1.079.613,37
VALOR TOTAL: 100% - R\$ 1.542.304,81

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1505-9
CONTA CORRENTE: 142.697-7

Atesto que os SERVIÇOS/MATERIAIS descritos neste documento, foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Destinados à pagamento da
14ª medição parcial
de contrato do Prédio
Anexo da Assembleia

Em 19/12/25

Antonio Lopes Braga Junior
Diretor de Área Administrativa

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	18.507,66	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.542.304,81	462.691,44	0,00	1.079.613,37	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	53.980,67	0,00	1.469.816,48	1.542.304,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 207.440,00 Federal e R\$ 77.115,24 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17210001204490667900013725000600005425120328557936
Visualizado em: 19/12/2025 11:46:30
Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.





Contrato nº 22/2024

PROCESSO: 2024/38960/000628

ASSUNTO: MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0022/2024 – OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO,
INTERESSADO: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

ATESTO

ATESTO à nota fiscal nº 054/2025, no valor de R\$ 1.542.304,81 (Um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil e trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos). Referente à 14ª Medição Parcial da Execução da Construção do Prédio Anexo da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins no município de Palmas - TO. A Nota Fiscal foi satisfatoriamente recebida e o seu valor está de acordo.

Palmas – TO, 19 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
André Luiz Costa Lima
Matrícula: 11684976-4
Fiscal de Obra.





PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRIBUINTE**

CPF/CNPJ: 04.490.079/0001-37

Contribuinte: **CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA** Inscrição: 187879

Endereço oficial: **ASR SE 105, ALAMEDA 11, QI-E, LOTE 11-A, LOTE 11-A QI-E, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **1012 S, ALAMEDA 11, Nº S/N, LOTE 11-A QI-E, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **04.490.079/0001-37**
Código de validação: **a97b7.f6187.3b18e-1329232**

Palmas, 19 de Dezembro de 2025 às 11:51.

Certidão válida até 17 de Fevereiro de 2026





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

7452633



Validador

55582458894691657589169976157597

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

CNPJ : 04.490.079/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD. 1012 SUL, S/N, ECO INDUSTRIAL - PLANO DIR.SUL - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - 11h 52m 48s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou inscrição Estadual.

Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins <http://www.to.gov.br/sefaz>



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/validador> informando o código: 89D6B175023872C2 | SGD:2025/38989/097405



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
CNPJ: 04.490.079/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:48:10 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **241E.CC93.BAC2.138D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.490.079/0001-37
Razão Social: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Endereço: Q ASR SE 105 ALAMEDA 11 S/N LOTE 11-A QI-E / PLANO DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77023-670

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120409371426154101

Informação obtida em 15/12/2025 18:01:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 04.490.079/0001-37

Certidão nº: 70695873/2025

Expedição: 19/11/2025, às 08:35:05

Validade: 18/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 04.490.079/0001-37, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação de nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal de Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: andt@tst.jus.br





Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CNPJ: 25.053.125/0001-00)		Documento 2025NL002277	Emissão 22/12/25
Valor Bruto 1.542.304,81	Valor Líquido 1.469.816,48		
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2025NE001206
Credor	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Programa de trabalho	01.031. 1141. 1106 - Ampliação das instalações físicas da Assembleia Leg...
Natureza	449051 - OBRAS E INSTALACOES
Unidade Orçamentária	01010 - Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas...	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24996247 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo	2852023

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
270 - Obras e Instalações	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	5297 - Reconhecimento da Obrigação com Incorporação de Ativo		1.542.304,81

Retenção

Classificação da Retenção	Base de Cálculo	Valor
Tipo de Retenção: 73 - ISS Credor da Retenção: 24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	0,00	53.980,67
Tipo de Retenção: 72 - IRRF PJ - Conta Unica NL Credor da Retenção: 01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	1.542.304,81	18.507,66
Total Retenção (-)	1.542.304,81	72.488,33

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Nota Fiscal	202500000000054	2852023	12/2025	19/12/2025	1.542.304,81
Total Documentos Comprobatórios					1.542.304,81

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000054 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.



Programação de Desembolso Orçamentária

Encerrado até Novembro

Identificação

UG Liquidante 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Documento 2025PD003511	Emissão 22/12/25
UG Pagadora 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Ordem Bancária	Domicílio Bancário Origem 070 - 0380 - 0003800167303 - Conta Unica
Favorecido 04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA		Domicílio Bancário Destino 001 - 1505 - 1426877
Valor por Extenso Hum milhão e quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos		Valor 1.469.816,48

Detalhamento

Nota Liquidação	2025NL002277
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2025NE001206
Credor	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Natureza	449051 - OBRAS E INSTALACOES
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24996247 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Domicílio Bancário Destino	001 - 1505 - 1426877
Competência	12/2025
Processo	2852023

Aline Gracyelle P.S. Rodrigues
Controladora Interna
Assembleia Legislativa - TO

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
270 - Obras e Instalações	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	5286 - Pagamento consumindo Limite de Saque	98 - Pagamento pela Própria UG		1.469.816,48

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000054 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.

Andrey Marques Queiroz Rocha
Diretor de
Área Orçamentária e Financeira
Mat. 13368

Irisfran de Sousa Pereira
Diretor Geral

Dep. Amélio Cayres
Presidente



Município de Palmas
Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.



Valor a pagar: R\$ 53.980,67
Vencimento: 15/01/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 22/12/2025	Nº Guia 865108	Operador ANDREY MARQUES QUEIROZ ROCHA	
Razão Social ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		Vencimento 15/01/2026	
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 25.053.125/0001-00	Fone (63)3212-5148	E-mail cofin@al.to.leg.br
Endereço de Correspondência Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio, Plano Diretor Norte - Palmas - To - 77001-902			

Competência	Tributo	Residual (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atualização (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)
12/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	53.980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	53.980,67

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81610000539 5 80673066202 0 60115555525 8 00008651080 7 Total em R\$: 53.980,67
Comprovante do Contribuinte

81610000539 5 80673066202 0 60115555525 8 00008651080 7



Município de Palmas

Vencimento 15/01/2026	Data de Emissão 22/12/2025	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 865108	
Razão Social ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			53.980,67	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 53.980,67

Observações

Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco Itaú S.A., Caixa, Bradesco, Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB e Santander.



Programação de Desembolso de Retenção

Encerrado até Novembro

Identificação	Documento	Emissão
UG Liquidante 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2025PD003512	22/12/25
UG Pagadora 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Ordem Bancária	Domicílio Bancário Origem 070 - 0380 - 0003800167303 - Conta Unica
Favorecido 24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO		Domicílio Bancário Destino 070 - 0380 - CODBARRAS
Valor por Extenso Cinquenta e três mil e novecentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos		Valor 53.980,67

Detalhamento

Tipo de Retenção	ISS
Banco Pagador	070 - BANCO REGIONAL DE BRASILIA SA
Credor da Retenção	PREFEITURA DE PALMAS - TO
Competência	12/2025
Processo	2852023

Aline Graciete P.S. Rodrigues
Controladora Interna
Assembleia Legislativa - TO

Itens

Número da NL	2025NL002277 - 010100
Número da NE	2025NE001206 - 010100
Ano	2025
Mês Competência	12 - Dezembro
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Tipo Patrimonial	270 - Obras e Instalações
Sub-item da Despesa	91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Vinculação de Pagamento	98 - Pagamento pela Própria UG
Grupo de Liberação de Cotas...	1 - Tesouro Cota
Código da receita do tributo	0 - Indefinido
DEA	Código: 00000000; Termo: INDEFINIDO
Credor Secundário	9999999999999999 - CREDOR INDEFINIDO
Número da NE	010100.2025NE001206
Credor	04490079000137
Valor	53.980,67

Andrey Marques Queiroz Rocha
Diretor de
Área Orçamentária e Financeira
Mat. 13368

Irisfran de Sousa Pereira
Diretor Geral

Dep. Amélio Cayres
Presidente

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
81610000539-5 80673066202-0 6011555525-8 00008651080-7		53.980,67
		53.980,67

Total

Observação

RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000054 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.
