



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
 Secretário
 NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 17ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S): PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 16.397.164,39 (dezesesseis milhões, trezentos e noventa e sete mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 17ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 1.777.176,49 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil e cento e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
 Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	15.483.594,99
Total dos Reajustamentos -----	R\$	913.569,40
Valor Global Atual -----	R\$	16.397.164,39
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	14.619.987,90

Saldo desta a pagar ----- R\$ 1.777.176,49

Palmas - TO, 18 de março de 2026

Atenciosamente,

Dep. Amélio Cayres
 Presidente

Visto:

Aprovo:

Engº Tulio Parreira Labre
 Presidente - Interveniente

Amélio Cayres de Almeida
 Presidente da Assembléia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Tulio Parreira Labre EM 20/03/2026 09:46:39

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.tc.gov.br/verificar> informando o código: A599E33A02501A4A | SGD:2026/38969/012488





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatório de aprovação.pdf do documento **2026/38969/012488** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
TÚLIO PARREIRA LABRE	20/03/2026 09:46:39 Assinado por LOGIN E SENHA por: Túlio Parreira Labre
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	20/03/2026 09:02:08 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	18/03/2026 11:24:26 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	18/03/2026 09:25:18 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 17ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** **Processo Medição:** 00628/3096/2024
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 01320/3896/2023 **Processo Medição:** 00628/3096/2024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 16/03/2026 **Período de Avaliação:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Nº da Parcela: 017 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS **Rodovia:**
Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade Qlde.	Contr+AditivQlde.	Acumulada Ant.Qlde.	Realiz. no Período	Qlde. Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS											
01.01.000	PROJETOS											
01.01.001	PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.085,89390	208.589,39000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.002	FUNDAÇÕES	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	284,44010	28.444,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.003	ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.004	ESTRUTURA METÁLICA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	379,25340	37.925,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.005	HIDROSSANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.006	ELÉTRICO, LUMINOTÉCNICO E SPDA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.007	DADOS E VOZ (CABEAMENTO ESTRUTURADO), SOM, ALARME, CFTV	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	455,10410	45.510,41000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.008	AR CONDICIONADO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.009	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	227,55210	22.755,21000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.010	TRATAMENTOS (IMPERMEABILIZAÇÕES, ACÚSTICA, ISOLAMENTOS)	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	113,77600	11.377,60000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.011	SEGURANÇA DO TRABALHO - NR18 E NR35	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	56,88800	5.688,80000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.012	ARTE GRÁFICA, COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	132,73870	13.273,87000	0,00000	0,00000	0,00000
01.02.000	LICENCIAMENTO											

Diretoria de Tecnologia da Informação - RL_MEDICOES - Analítica - BIANCA MARQUES - 18/03/2026 - Página : 1 - Continuação...

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues - Engª Civil Camylla Ferreira César - Engº Civil Candido F. Colino jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmp - Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas - Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 18/03/2026 11:24:27
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgcd.io.gov.br/verificador/> informando o código: C09556790250175B | SGD:2026/38969/012494





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 17ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** **Processo Medição:** 00628/3096/2024
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 01/02/2026 a 28/02/2026 **Processo:** 01320/3896/2023
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 16/03/2026 **Período de Avaliação:** 01/02/2026 a 28/02/2026 **Data Assin.:** 28/05/2024
Nº da Parcela: 017 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024

Rodovia:

Local: PALMAS
Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade Qtd.	Contr+Aditiv Qtd.	Acumulada Ant.Qtd.	Realiz. no Período	Qtde. Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.02.001	ALVARÁ DE CONTRUÇÃO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	94,81340	9.481,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.02.002	ALVARÁ CORPO DE BOMBEIROS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	94,81340	9.481,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	4.702,74250	470.274,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.001	SERVIÇOS GERAIS	%	100,00000	7,68925	-7,68925	0,00000	0,00%	7.205,81510	720.581,51000	55.407,31376	-55.407,31376	0,00000
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	227,55210	22.755,21000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.003	LIMPEZA DE TERRENO	%	100,00000	6,45491	-6,45491	0,00000	0,00%	910,20820	91.020,82000	5.875,31201	-5.875,31201	0,00000
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	12.325,73640	1.232.573,64000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.005	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES)	%	100,00000	29,15261	-29,15261	0,00000	0,00%	35.991,15030	3.599.115,03000	1.049.235,96815	-1.049.235,96815	0,00000
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	100,00000	3,37065	-3,37065	0,00000	0,00%	10.239,84280	1.023.984,26000	34.514,92546	-34.514,92546	0,00000
01.03.007	ALVENARIAS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	21.863,96010	2.186.396,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.008	ESQUADRIAS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	4.702,74250	470.274,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.009	COBERTURA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	948,13360	94.813,36000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.010	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	6.636,93500	663.693,50000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.011	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.711,66200	271.166,20000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.012	COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	7.585,06860	758.506,86000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.013	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALARME INCENDIO, SOM, RELOGIO, CHAM ENFERM.	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%					

Diretoria de Tecnologia da Informação **RL_MEDICOES** Analítica **BIANCA MARQUES** 18/03/2026 **Página : 2** Continua...

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

AGETO
 Fis 1471
 18/05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 18/03/2026 11:24:27
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: C09556790250175B | SGD-2026/38969/012494





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 17ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** **Processo Medição:** 00628/3096/2024
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 01320/3896/2023 **Processo Medição:** 00628/3096/2024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 16/03/2026 **Período de Avaliação:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Nº da Parcela: 017 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Rodovia:

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Contr+Aditiv	Qtde.- Acumulada	Ant. Qtde.	Realiz. no Período	Qtde. Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.03.014	CABEAMENTO ESTRUTURADO, FIBRA OPTICA E CFTV	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.161,74450	216.174,45000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.015	REVESTIMENTOS DE PAREDES	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	3.413,28090	341.328,09000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.016	REVESTIMENTO DE PISOS	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	12.325,73640	1.232.573,64000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.017	REVESTIMENTOS DE TETOS	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1.934,19250	193.419,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.018	LOUÇAS E METAIS	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.554,77400	255.477,40000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.019	VIDROS	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	17.066,40430	1.706.640,43000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.020	PINTURA	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	3.280,54220	328.054,22000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.021	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ELEVADORES	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	13.565,16120	1.358.516,12000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.022	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	9.185,82145	918.582,14500	0,00000	0,00000	0,00000
SubTotal Sub Item.....											1.145.033,51938	-1.145.033,51938	0,00000	
SubTotal Item.....											1.145.033,51938	-1.145.033,51938	0,00000	0,00000
Total Parcial.....											1.145.033,51938	-1.145.033,51938	0,00000	0,00000
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência											0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....											1.145.033,51938	-1.145.033,51938	0,00000	0,00000

Diretoria de Tecnologia da Informação RL_MEDICOES Analítica BIANCA MARQUES 18/03/2026 Página : 3 Continua...

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 18/03/2026 11:24:27
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: C09555790250175B | SGD:2026/38969/012494

AGETO
 Fis 1472
 Bb





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 17ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** **Processo Medição:** 00628/3096/2024
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 01320/3896/2023 **Processo Medição:** 00628/3096/2024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 16/03/2026 **Período de Avaliação:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Nº da Parcela: 017 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS **Rodovia:**
Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	PLANILHA APROVADA									
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO									
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETO:	%	100,00000	100,00000	100,00%	5.856,94340	585.694,34000	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
	SERVIÇOS TÉCNICOS									
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	66,56000	15,86000	82,42%	9.082,94830	908.294,83000	604.561,03885	144.055,56004	748.616,59889
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	0,00000	100,00%	3.223,75990	322.375,93000	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	90,00002	9,99998	100,00%	587,53250	58.753,25000	52.877,93875	5.875,31325	58.753,25000
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	0,00000	100,00%	3.675,77830	367.577,83000	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	57,37510	42,62690	100,00%	24.614,41130	2.461.441,13000	1.412.205,08096	1.049.236,04904	2.461.441,13000
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	76,90981	15,73019	92,64%	9.599,30560	959.930,56000	738.280,76983	150.998,90096	889.279,67078
01.01.008	FORRO	%	37,03000	12,57000	49,60%	5.161,48737	516.148,73700	191.129,87731	64.879,89624	256.009,77355
01.01.009	COBERTURA	%	97,21059	0,00000	97,21%	5.992,16562	599.216,56200	582.501,95530	0,00000	582.501,95530
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	94,14000	3,59000	97,73%	2.388,19990	238.819,99000	224.825,13859	8.573,63764	233.398,77623
01.01.011	ESQUADRIAS	%	71,82000	9,07000	80,89%	18.344,92110	1.834.492,11000	1.317.532,23340	166.388,43438	1.483.920,66778
01.01.012	REVESTIMENTOS	%	79,49000	12,54000	92,03%	42.189,19080	4.218.919,08000	3.353.618,77669	529.052,45263	3.882.671,22932
01.01.013	PINTURA	%	17,82000	28,74000	46,56%	7.362,26440	736.226,44000	131.195,55161	211.591,47886	342.787,03046

Diretoria de Tecnologia da Informação RL_MEDICOES Analítica BIANCA MARQUES 18/03/2026 Página : 4 Continua...

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Fiscal/ageto/sop/dmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 18/03/2026 11:24:27
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: C09558790250175B | SGD:2026/38969/012494

AGETO
 Fis 1473
 [Assinatura]





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 17ª PARCELA

Contratada: 0490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Contrato: 00022/2024

Depto Executor: 1

Data da Subcontratação: 01/02/2026

Processo: 01320/3896/2023

Processo Medição: 00628/3096/2024

SubContrato: 0

Data da Parcela: 16/03/2026

Período de Avaliação: 01/02/2026 a 28/02/2026

Nº da Parcela: 017

Nº da O.S.: 000220022024

Data Assin.: 28/05/2024

Local: PALMAS

Rodovias:

Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Contr.	Aditiv.	Qtde.	Acumulada	Ant.	Qtde.	Realiz.	no Período	Qtde.	Acum.	Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.01.014	LOUÇAS E METAIS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,124,23600	112,423,60000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.015	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00000	77,75092	0,00000	77,75092	77,75092	77,75092	77,75092	77,75092	77,75092	77,75092	77,75092	77,75092	77,75092	1,105,17080	110,517,08000	85,928,04646	0,00000	85,928,04646
01.01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	100,00000	68,35256	0,00000	68,35256	68,35256	68,35256	68,35256	68,35256	68,35256	68,35256	68,35256	68,35256	68,35256	749,52160	74,952,16000	51,231,72014	0,00000	51,231,72014
01.01.017	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	%	100,00000	54,52000	0,00000	54,52000	54,52000	54,52000	54,52000	54,52000	54,52000	54,52000	54,52000	54,52000	54,52000	2,203,20660	220,320,66000	120,118,82383	0,00000	120,118,82383
01.01.018	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	%	100,00000	28,69166	0,00000	28,69166	28,69166	28,69166	28,69166	28,69166	28,69166	28,69166	28,69166	28,69166	28,69166	1,090,53370	109,053,37000	31,289,22214	0,00000	31,289,22214
01.01.019	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	100,00000	32,29000	0,00000	32,29000	32,29000	32,29000	32,29000	32,29000	32,29000	32,29000	32,29000	32,29000	32,29000	7,849,60390	784,960,39000	253,463,70993	0,00000	253,463,70993
01.01.020	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	338,43280	33,843,28000	0,00000	0,00000	0,00000	
01.01.021	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	%	100,00000	64,23000	0,00000	64,23000	64,23000	64,23000	64,23000	64,23000	64,23000	64,23000	64,23000	64,23000	64,23000	6,219,07660	621,907,66000	399,451,29002	85,325,73095	484,777,02097
01.01.022	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CFTV	%	100,00000	40,48000	0,00000	40,48000	40,48000	40,48000	40,48000	40,48000	40,48000	40,48000	40,48000	40,48000	40,48000	1,116,82690	111,682,69000	45,209,15291	9,191,48539	54,400,63830
01.01.023	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434,72630	43,472,63000	0,00000	8,894,50010	8,894,50010	
01.01.024	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - HVAC	%	100,00000	64,52000	0,00000	64,52000	64,52000	64,52000	64,52000	64,52000	64,52000	64,52000	64,52000	64,52000	64,52000	21,544,68250	2,154,468,25000	1,390,062,91490	134,438,81880	1,524,501,73370
01.01.025	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	6,005,07440	600,507,44000	300,253,72000	0,00000	300,253,72000
SubTotal Sub Item.....																				
SubTotal Item.....																				
																		12.561.385.05960	2.922.210.01155	15.483.595.07115
																		12.561.385.05960	2.922.210.01155	15.483.595.07115

SubTotal Sub Item.....

SubTotal Item.....

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmp Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 18/03/2026 11:24:27

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgcd.to.gov.br/verificador> informando o código: C06556790250175B | SGD:2026/38969/012494





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 17ª PARCELA

Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Contrato: 00022/2024

Depto Executor: 1

Data da SubContratação: 01/02/2026

Processo Medição: 00628/3096/2024

SubContrato: 0

Data da Parcela: 16/03/2026 Período de Avaliação: 01/02/2026 a 28/02/2026

Nº da Parcela: 017

Nº da O.S.: 000220022024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Total Parcial.....	12.561.385,05960	2.922.210,01155	15.483.595,07115
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência	0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....	12.561.385,05960	2.922.210,01155	15.483.595,07115
Total das Parcelas.....	13.706.418,57898	1.777.176,49217	15.483.595,07115

Importa o Líquido a pagar da medição em R\$ 1.777.176,49 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil e cento e setenta e seis reais e quatrocentos e nove centavos) Palmas-TO, 18 de março de 2026.

Diretoria de Tecnologia da Informação RL_MEDICOES

Análítica

BIANCA MARQUES

18/03/2026

Página : 6

FIM

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 18/03/2026 11:24:27

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: C09556790250175B | SGD:2026/38969/012494





Processo Medição 00628/3096/2024
Data da Assinatura: 28/05/2024
Valor Contrato: 18.786.000,00
Valor dos Aditivos: 0,00
Valor Total Contrato: 18.786.000,00
Prazo: 549 Dias
Prorrogações Conced.: 90 Dias

Contrato: 00022/2024 **SubContrato:** 0 **Empresa:** 04.490.079/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA
Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICIPIO DE PALMAS - TO
Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICIPIO DE PALMAS - TO.

Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)				EXECUTADO			TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido		R\$ Acumulado	Acum.	REAJUSTE			
			R\$	R\$			R\$	R\$ Acumulado		
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	0,00	638.331,24	2.852.207,09
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	0,00	111.643,57	2.963.850,66
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	51.593,39	51.593,39	51.593,39	658.274,71	3.622.125,37
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,97	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	37.143,74	88.737,13	88.737,13	473.913,11	4.096.038,48
9 a	01/06/2025 a 30/06/2025	712.121,47	3,79 %	4.719.422,82	25,12 %	60.560,23	149.297,36	149.297,36	772.681,70	4.868.720,18
10 a	01/07/2025 a 31/07/2025	359.159,70	1,91 %	5.078.582,52	27,03 %	30.543,65	179.841,01	179.841,01	389.703,35	5.258.423,53
11 a	01/08/2025 a 30/08/2025	692.582,46	3,68 %	5.771.164,98	30,72 %	58.898,59	238.739,60	238.739,60	751.481,05	6.009.904,58
12 a	01/09/2025 a 30/09/2025	1.496.399,98	7,96 %	7.267.564,96	38,68 %	127.256,84	365.996,44	365.996,44	1.623.656,82	7.633.561,40
13 a	01/10/2025 a 31/10/2025	1.581.953,81	8,42 %	8.849.518,77	47,10 %	134.532,51	500.528,95	500.528,95	1.716.486,32	9.350.047,72
14 a	01/11/2025 a 30/11/2025	1.542.304,81	8,20 %	10.391.823,58	55,31 %	131.160,68	631.689,63	631.689,63	1.673.465,49	11.023.513,21
15 a	01/12/2025 a 31/12/2025	1.856.612,33	9,88 %	12.248.435,91	65,19 %	157.890,02	789.579,65	789.579,65	2.014.502,35	13.038.015,56



Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas
 Fiscal/ageto/sop/dfmop Publicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 18/03/2026 11:24:27
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 8251EA850250175C | SGD:2026/38969/012494





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Faturamento

Contrato: 00022/2024 SubContrato: 0 Empresa: 04.490.079/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA Processo Medição 00628/3096/2024

Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)		REAJUSTE		TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.		
16 a	01/01/2026 a 31/01/2026	1.457.982,59	7,76 %	13.706.418,50	72,96 %	1.581.972,34	14.619.987,90
17 a	01/02/2026 a 28/02/2026	1.777.176,49	9,46 %	15.483.594,99	82,42 %	1.928.311,13	16.548.299,03

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Faturamento BIANCA MARQUES 18/03/2026 Página : 2

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Collino Jr
 Fiscal/Ageto/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

AGETO
 Fis 1476
 B30

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/03/2026 09:02:08
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 18/03/2026 11:24:27
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: 8251EAB50250175C | SGD:2026/38969/012494





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AGETO
Fs 1477
AB6

FOTOGRAFICO RELATÓRIO

1º JAN 1989
ESTADO DO TOCANTINS

CONTRATO:00022/2024

OBRA : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

VISITA : 13/03/2026 REFERENTE À 17ª MEDIÇÃO

LOCAL : PALMAS

EMPRESA : CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA




ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 18/03/2026 09:29:10

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 2CA4B5800250175D | SGD:2026/38969/012494





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AGETO
Fis 1478
Blo

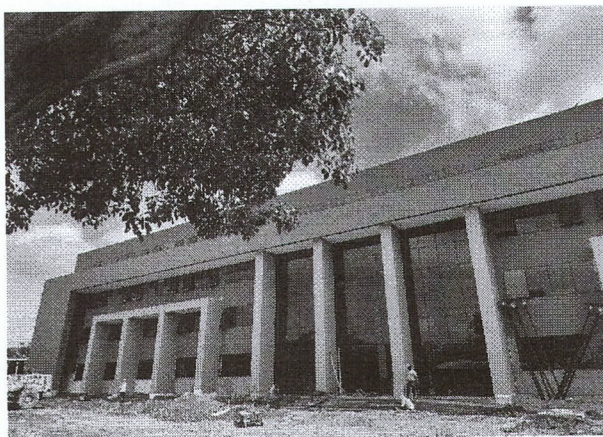

=> Fachada Frontal - Pintura


=> Fachada Frontal - Pintura

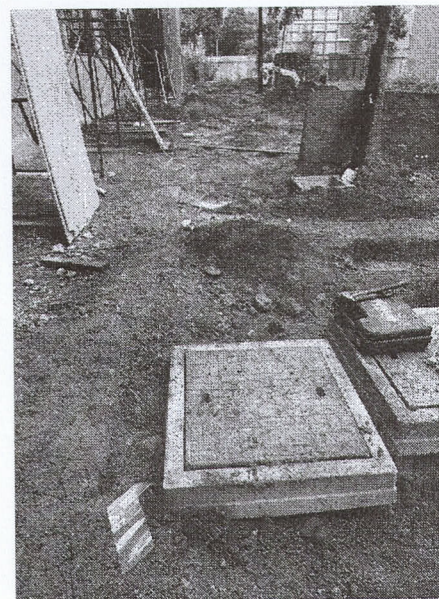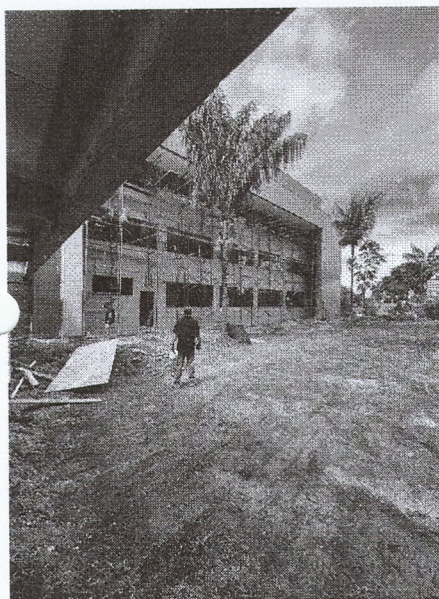


=> Fachada Posterior

=> Instalações Pluviais




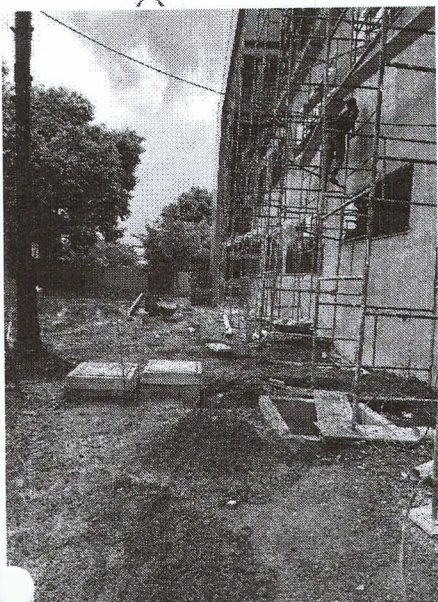

=> Instalações Pluviais - Fachada Posterior

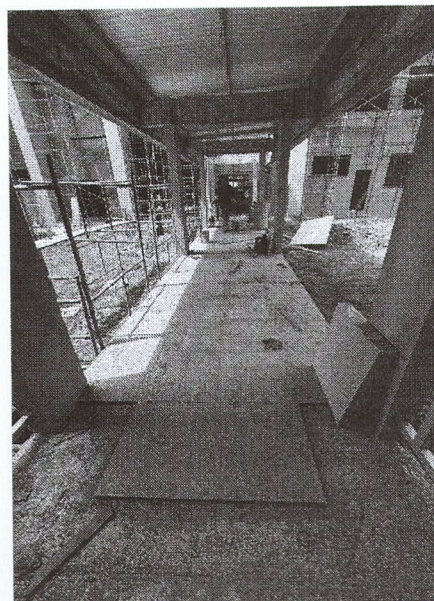

=> Revestimento de Pisos

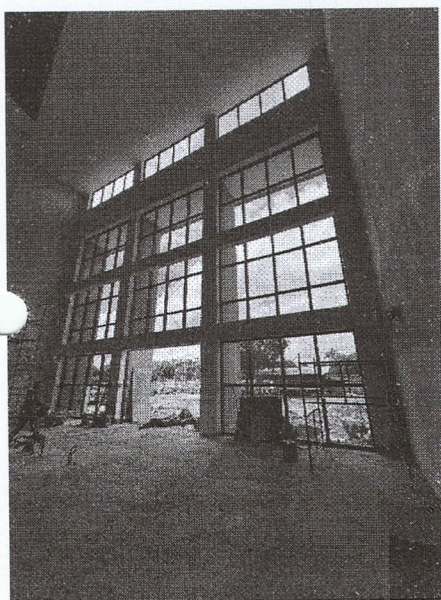

=> Recepção - Pintura




=> Tratamento de Juntas de Dilatação







=> Tratamento de Juntas de Dilatação

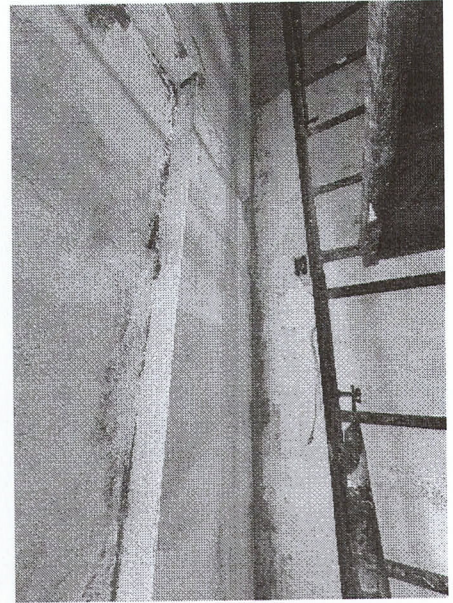

=> Tratamento de Juntas de Dilatação

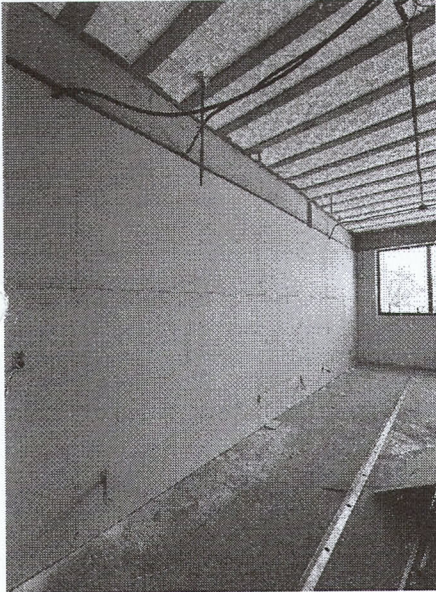


=> Térreo - Vedação e Revestimentos

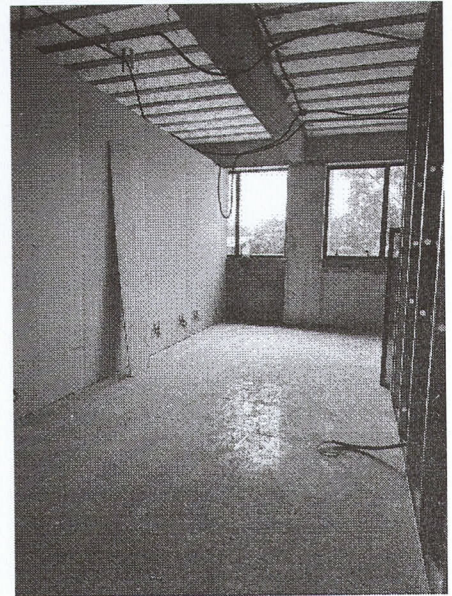


=> Térreo - Vedação e Revestimentos




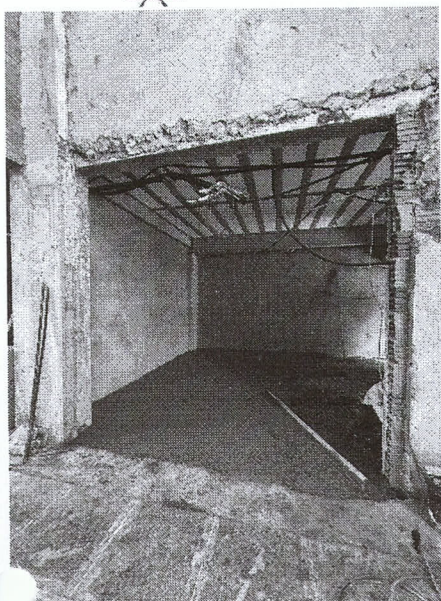


=> Térreo - Revestimento Interno

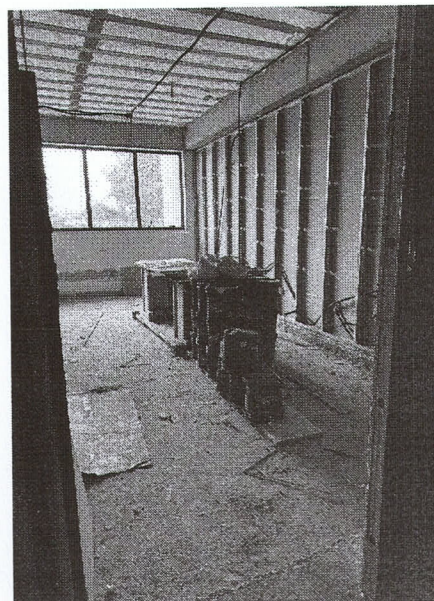

=> Térreo - Revestimento Interno

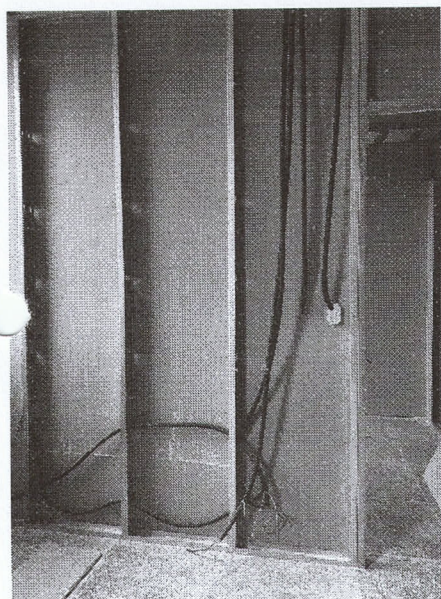

=> Térreo - Instalações Elétricas

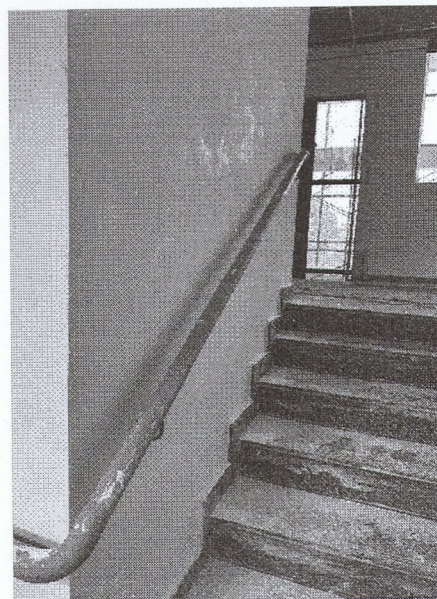


=> Corrimão






=> Corrimão

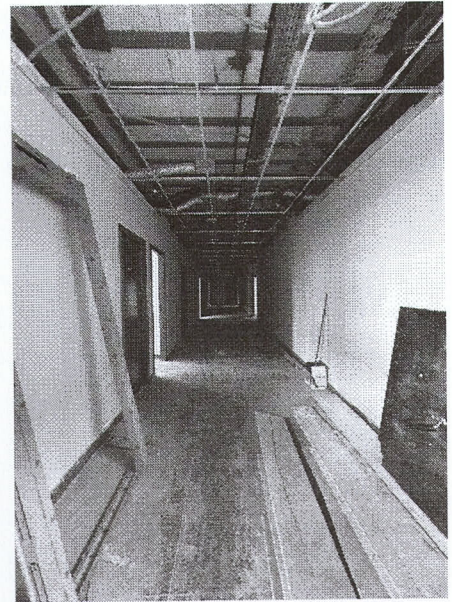

=> Circulação - Pintura - 1 Pavimento



=> Pintura de Esquadria - 1 Pavimento

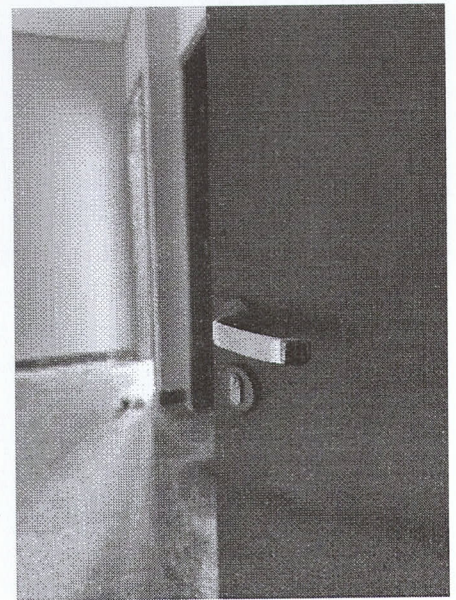


=> Pintura de Esquadria - 1 Pavimento





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AGETO
Fis 1483
AB

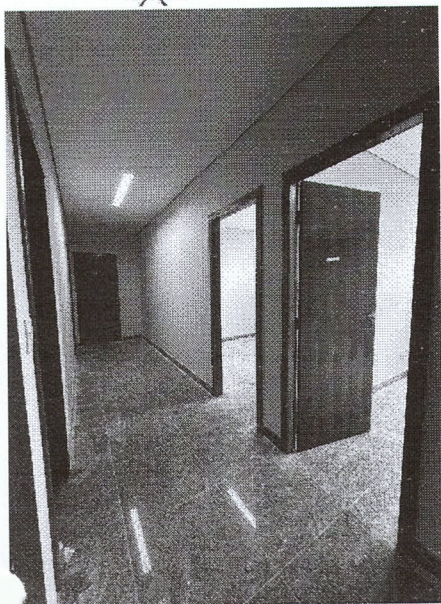

=> Pintura de parede, de esquadria - 1 Pavimento



=> Evaporadora e difusor de ar - 1 Pavimento




=> Interruptor - 1 Pavimento



=> Evaporadora e Difusor de Ar - 1 Pavimento




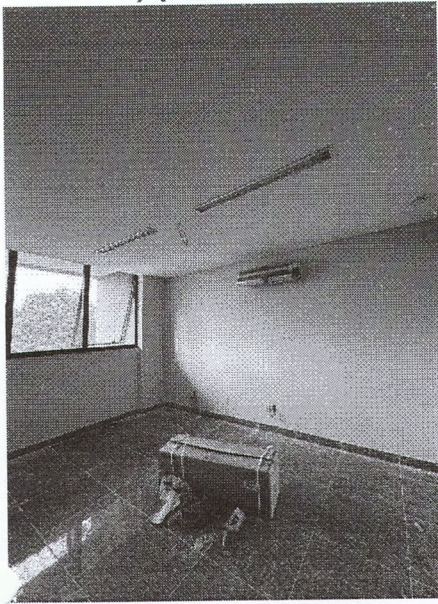


=> Pintura, lâmpada e evaporadora - 1 Pavimento



=> Tomadas - 1 Pavimento

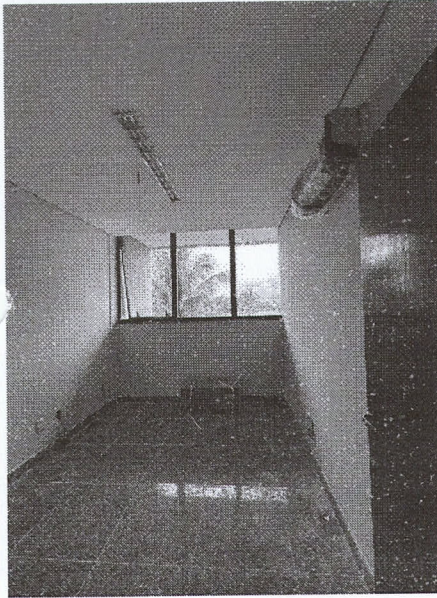


=> 1 Pavimento

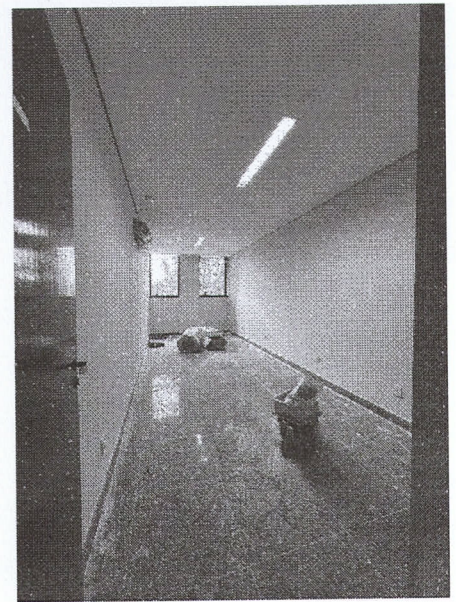


=> Evaporadora, difusor de ar e lampadas - 1 Pavimento




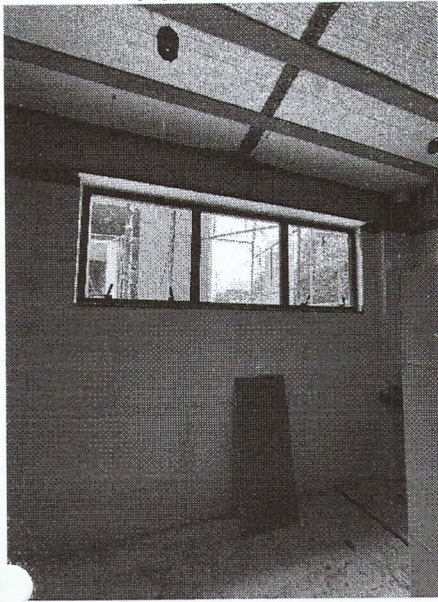


=> Esquadria de alumínio - 1 Pavimento

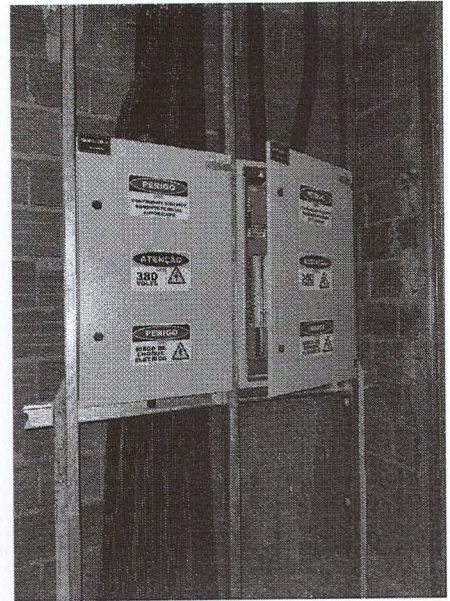

=> Quadro de distribuição e disjuntores - 1 Pavimento

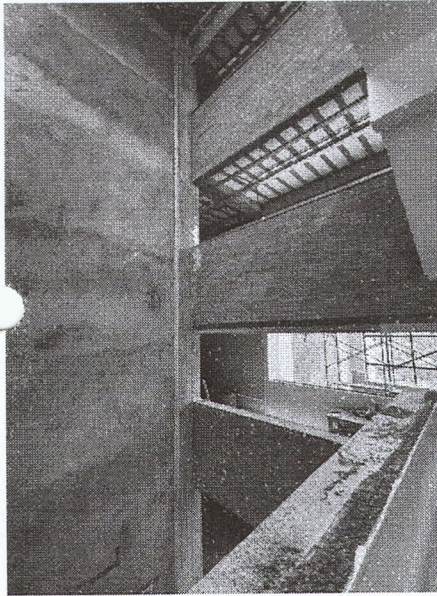

=> Revestimento Interno - Lado Direito

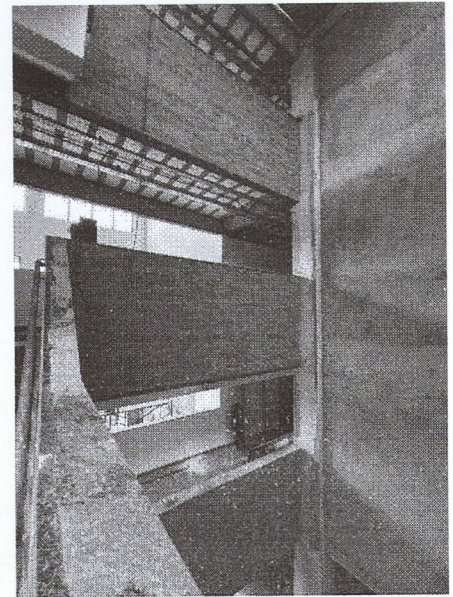


=> Revestimento Interno - Lado Esquerdo







=> Circulação - Pintura - 2 Pavimento

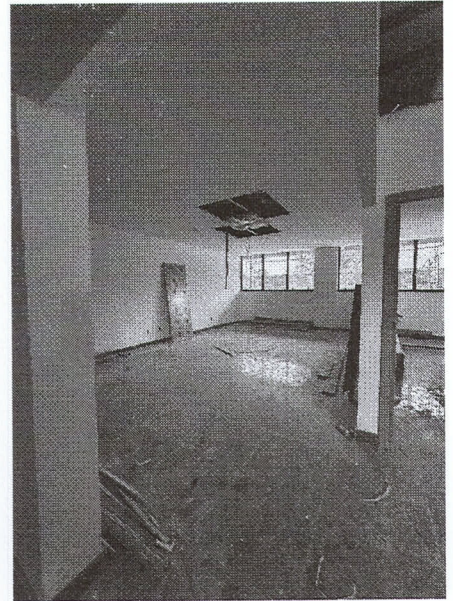

=> Acabamento e Pintura - 2 Pavimento

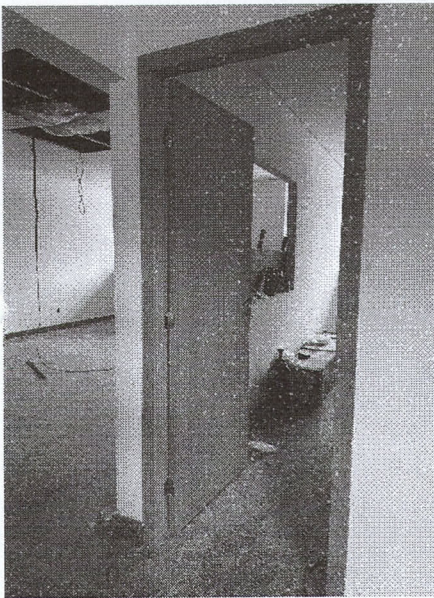

=> Esquadria - 2 Pavimento

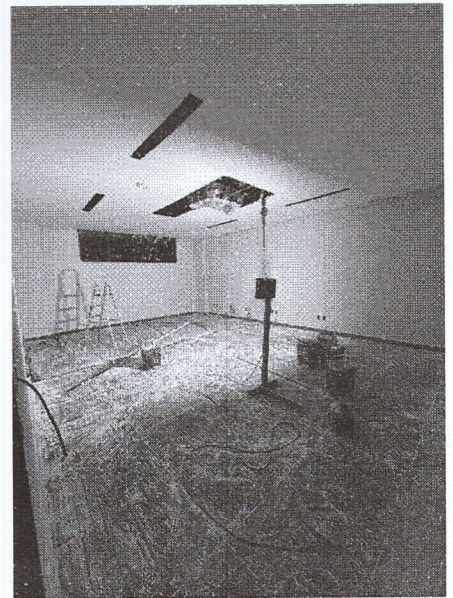


=> Acabamento, Pintura e Rodapés - 2 Pavimento






GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS


AGETO
Fls 1487
186

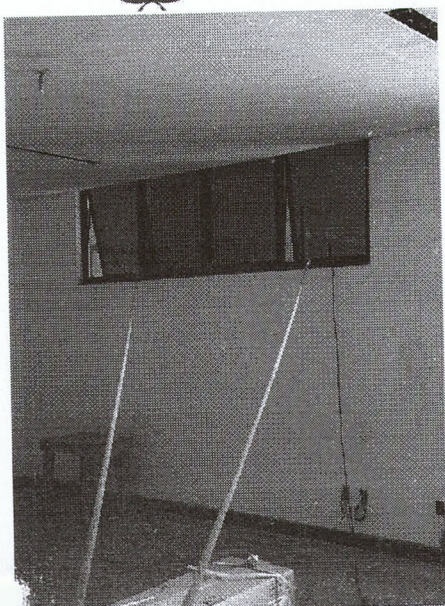


=> Esquadria de Alumínio - 2 Pavimento

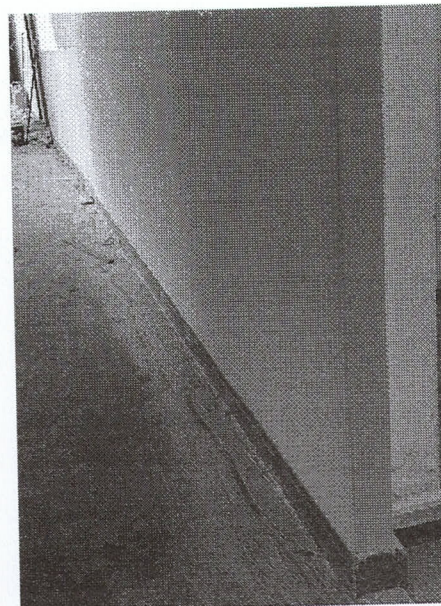

=> Rodapé - 2 Pavimento

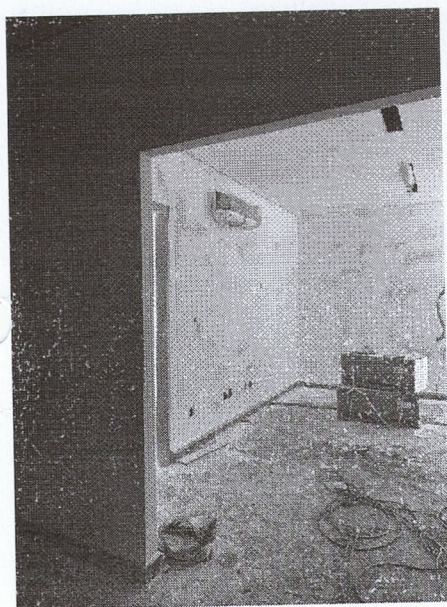

=> Acabamento e Pintura - 2 Pavimento

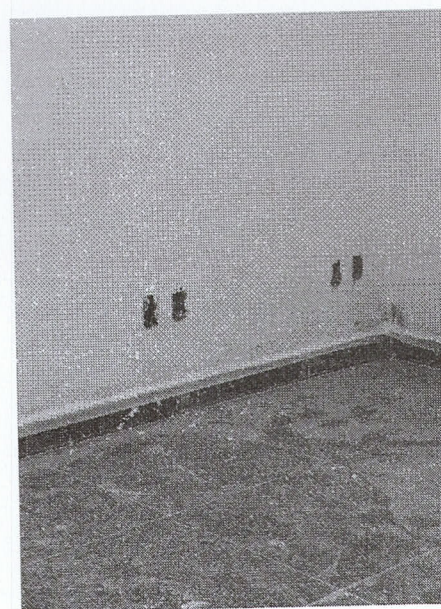

=> Acabamento e Rodapé - 2 Pavimento







=> Pintura - 2 Pavimento



=> Acabamento e Rodapés - 2 Pavimento

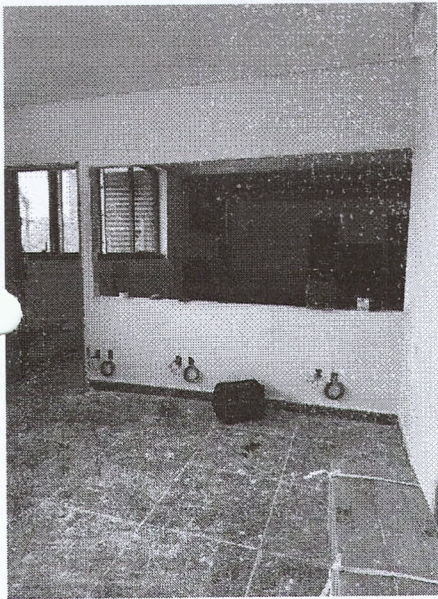


=> Pintura - 2 Pavimento

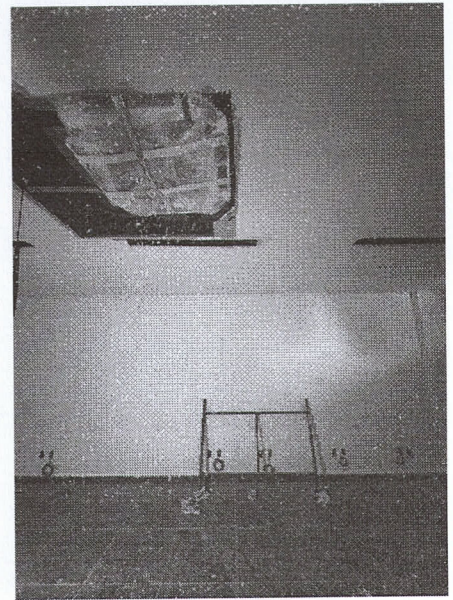

=> Pintura, Forro e Rodapés - 2 Pavimento




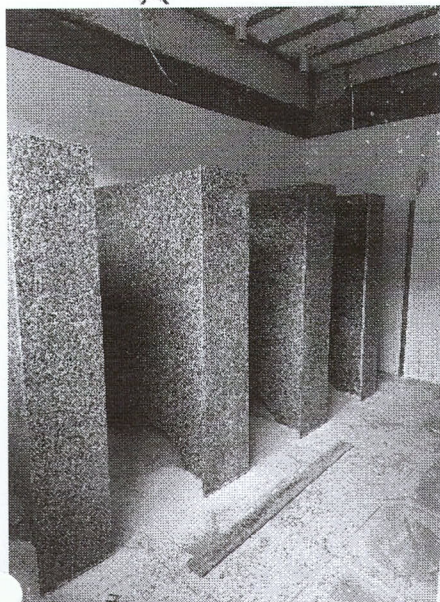

=> Divisórias - Banheiro - 2 Pavimento



=> Corrimão - 2 Pavimento

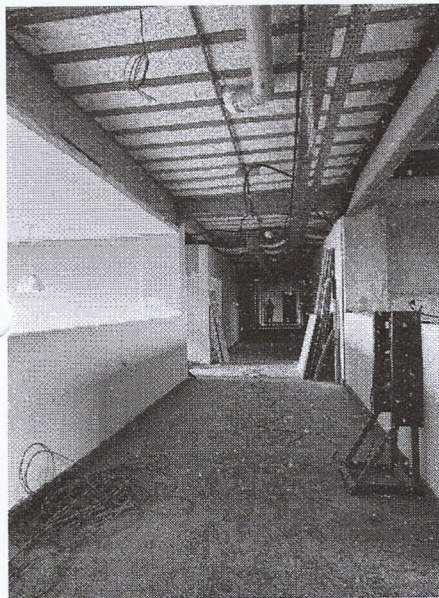

=> Circulação - 3 Pavimento




=> Paredes e Acabamento - 3 Pavimento





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS


AGETO
Fls 1490
186

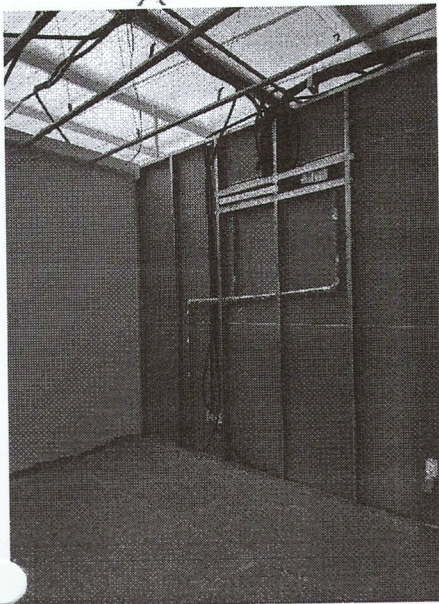

=> Instalações - 3 Pavimento



=> Forro em drywall e acabamentos - 3 Pavimento

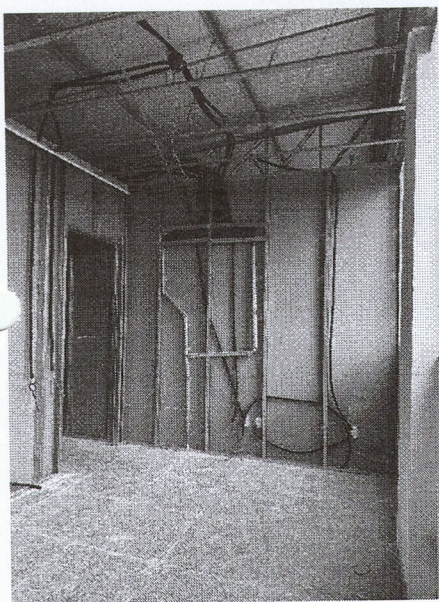


=> Instalações Elétricas - 3 Pavimento



=> Circulação - Vedação - 3 Pavimento




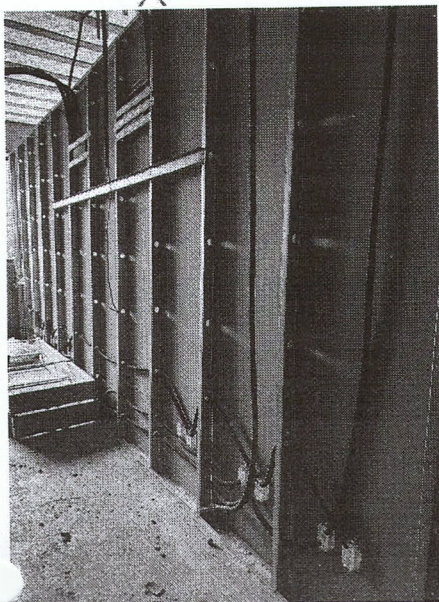


=> Instalações Elétricas - 3 Pavimento



=> Vedação e Instalações - 3 Pavimento

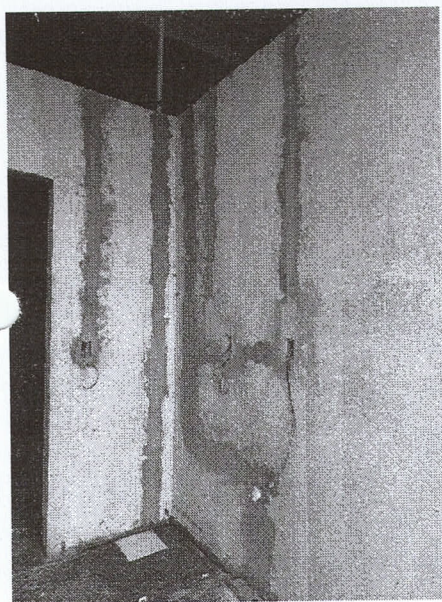


=> Instalações - 3 Pavimento

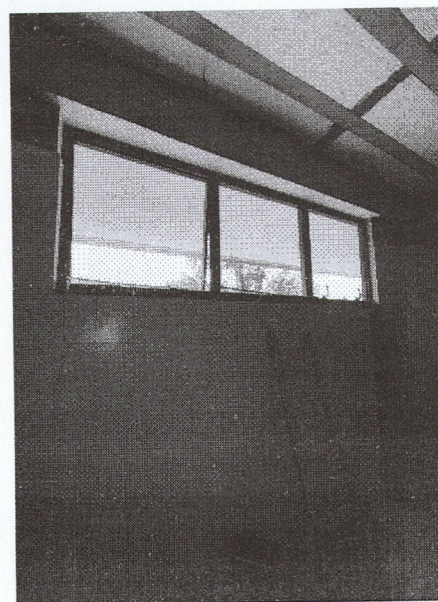


=> Esquadria de Alumínio - Banheiro - 3 Pavimento




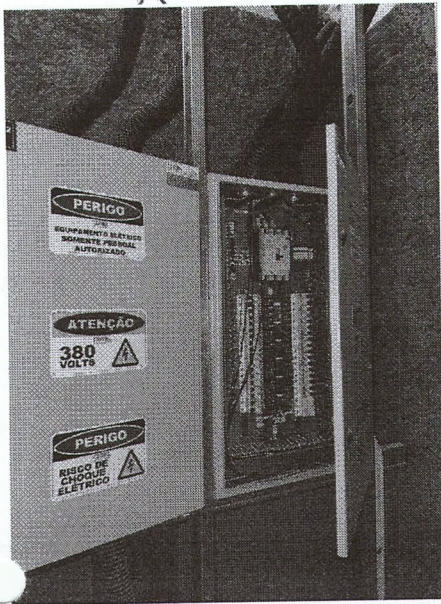


=> Quadro de Distribuição e Disjuntores - 3 Pavimento

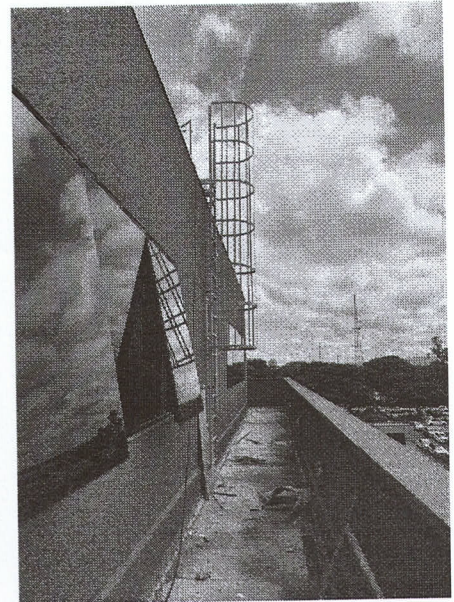

=> Escada de Marinheiro - 3 Pavimento

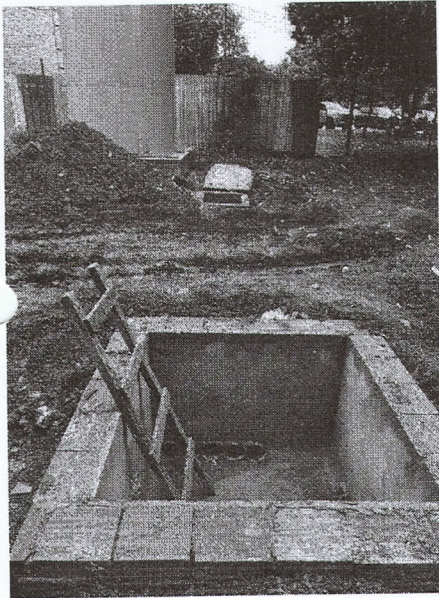

=> Entrada de Energia

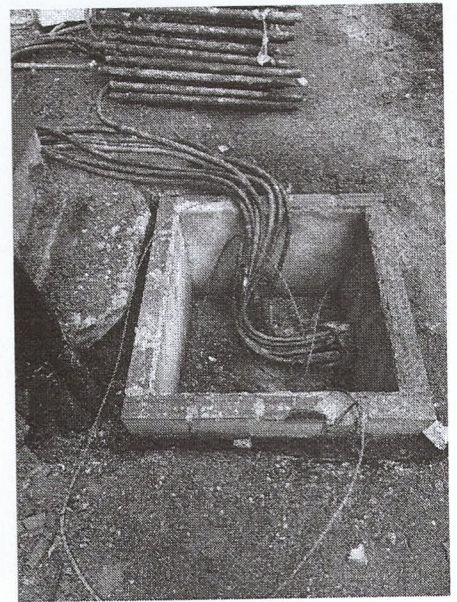

=> Entrada de Energia





Gov^o do Estado do Tocantins
 Ag^{nc}ia de Transportes, Obras E Infraestrutura
ANÁLISE CONTRATUAL (PROVISÓRIA)

AGETO
 Nº 1493
 AB

Contrato : 00022/2024 SubContrato : 0 Recurso: ASSEBL. LEG / TESOIRO-COTA / 00 / 00
 Empresa : CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA Data assinatura: 28/05/2024
 Data-Base : 04/2024 Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024 Data Licitação: 05/04/2024
 Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL
 Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Localidade (s) : PALMAS

VALORES

Valor Contrato a PI	:	18.786.000,00	
Aditivos	:	0,00	
Valor Total a PI	:	18.786.000,00	
Valor Medido a PI	:	15.483.594,99	82,42%
Valor Medido Reajustamento	:	1.064.704,04	
Valor Total Faturado	:	16.548.299,03	
Saldo do Contrato	:	3.302.405,01	17,58%
Última Medição	:	17ª - Parcial	
Período da Última Medição	:	01/02/2026 a 28/02/2026	
Situação	:	Em Andamento	

PRAZO / ADITIVOS

Data da Ordem de Serviço	:	24/06/2024	Data da Assinatura do Cont.	:	28/05/2024
Prazo Execução Contratual	:	549	Prazo de Vigência	:	731
Venc. do Prazo de Execução	:	24/12/2025	Venc. do Prazo de Vigência	:	28/05/2026

1ª Ordem de Aditivo : 19/12/2025 Prazo Exec.: 90 dias Venc. Prazo Exec.: 24/03/2026





MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2026000

00000007

Código Verificação

6Q8I-V7Z1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

20/03/2026 10:14:54

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

03/2026

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaua@acaua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

AGETO
Fis 1494
Bib

Endereço
Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592

PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO

PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MA - AIS: 30% - R\$ 533.152,95

MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 1.244.023,54

VALOR TOTAL: 100% - R\$ 1.777.176,49

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 142.687-7

Atesto que os SERVIÇOS/MATERIAIS descritos neste documento, foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

Destinados à *mtb de 140*

medidas de certificação do projeto plano de projeto

Emp 1/01/26

Antonio Lopes Braga Junior
Diretor de Área Administrativa

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

21.326,12

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

1.777.176,49

Alíquota ISS (%)

5,00

Valor dos Serviços (R\$)

1.777.176,49

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

88.858,82

Valor Líquido (R\$)

1.666.991,55

Valor Total da Nota (R\$)

1.777.176,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 239.030,24 Federal e R\$ 88.858,82 Municipal. Fonte: IBPT [3CA397]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17210001204490079000137260000000000726030339702586



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 7A9BB6740250B0BB | SGD:2026/38969/012907

Contrato nº 22/2024

PROCESSO: 2024/38960/000628

ASSUNTO: MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0022/2024 – OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

INTERESSADO: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

ATESTO

ATESTO à nota fiscal nº 007/2026, no valor de R\$ 1.777.176,49 (Um milhão, setecentos e setenta e sete mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Referente à 17ª Medição Parcial da Execução da Construção do Prédio Anexo da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins no município de Palmas - TO. A Nota Fiscal foi satisfatoriamente recebida e o seu valor está de acordo.

Palmas – TO, 20 de março de 2026.

Assinatura Digital

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues

FISCAL DE OBRA

Matrícula: 11809019

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77001-970 – Palmas/TO | (63) 3218-7101/7104





AGETO
Fls 1496
18/0

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **04.490.079/0001-37**

Contribuinte: **CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA** Inscrição: **187879**

Endereço oficial: **ASR SE 105, ALAMEDA 11, QI.E, LOTE 11-A, LOTE 11-A QI-E, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **1012 S, ALAMEDA 11, Nº S/N, LOTE 11-A QI-E, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria Municipal da Fazenda, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **04.490.079/0001-37**
Código de validação: **48a43.5dad5.861d2-1374768**

Palmas, 20 de Março de 2026 às 10:20.

Certidão válida até 19 de Maio de 2026





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

7762912



AGETO
Fls 1497
AB

Validador

50707609006855796577109215296500

AGETO
Fls X

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

CNPJ : 04.490.079/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD. 1012 SUL, S/N, ECO INDUSTRIAL - PLANO DIR.SUL - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 20 de Março de 2026 - 10h 21m 32s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

AGETO
Fls 1498
Bto

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
CNPJ: 04.490.079/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:22:25 do dia 20/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2026.

Código de controle da certidão: **1E4C.5FE6.BB15.D001**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.490.079/0001-37
Razão Social: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Endereço: Q ASR SE 105 ALAMEDA 11 S/N LOTE 11-A QI-E / PLANO DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77023-670

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030902111426154149

Informação obtida em 20/03/2026 10:20:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ACAUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.490.079/0001-37

Certidão nº: 17540286/2026

Expedição: 20/03/2026, às 10:19:18

Validade: 16/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ACAUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.490.079/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. b6b76132

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

CNPJ n. 04.490.079/0001-37

Certidão emitida em: 03/02/2026, às 17:34:06 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquiridos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 03/02/2026, 17:34:06





AGETO
Fis 1502
B6

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.490.079/0001-37 DUNS®: 89*****69
Razão Social: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ACAUA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/04/2026
Receita Municipal	Validade:	19/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal





AGÊNCIA DE TRANSPORTES,
OBRAS E INFRAESTRUTURA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



PROCESSO Nº: 2024/38960/000628

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS.

ASSUNTO: PAGAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO PARCIAL

PARA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS

DESPACHO Nº 021/2026/DFMOP

SGD: 2026/38969/013002

Anexados aos autos a Nota Fiscal, Atesto e Certidões da 17ª Medição Parcial. Encaminhamos o referido processo a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins - ALETO, para análise e providências.

Palmas, 23 de março de 2026.

(Assinado Digitalmente)

CAMYLLA F. CESAR BARBOSA

Dir. de Fisc. e Med. de Obras Públicas

Mat.: 1050621

(Assinado Digitalmente)

CANDIDO F. COLINO JR

Superintendente de Obras Públicas

Mat.: 604061



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 23/03/2026 08:53:15

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 23/03/2026 08:17:35

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 675E3CF90250E499 | SGD:2026/38969/013002
