



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
 Secretário
 NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 16ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 referente à : OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

LOCALIDADE(S) : PALMAS

Executados pela Empresa: CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 14.495.998,15 (quatorze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 16ª Medição Parcial - Contrato 00022/2024 é de R\$ 1.457.982,59 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	13.706.418,50
Total dos Reajustamentos -----	R\$	789.579,65
Valor Global Atual -----	R\$	14.495.998,15
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	13.038.015,56
Saldo desta a pagar -----	R\$	1.457.982,59

Palmas - TO, 19 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

Visto:

Aprovo:

Engº Tulio Parreira Labre
 Presidente - Interveniente

Amélio Cayres de Almeida
 Presidente da Assembléia Legislativa - Ordenador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 20/02/2026 14:23:20

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/02/2026 09:36:59

de Tec EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 2BD2824D024847ED | SGD:2026/38969/007393





REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo relatório de aprovação.pdf do documento **2026/38969/007393** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
TÚLIO PARREIRA LABRE	20/02/2026 14:23:20 Assinado por LOGIN E SENHA por: Túlio Parreira Labre
CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR	20/02/2026 09:36:59 Assinado por LOGIN E SENHA por: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR
CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA	20/02/2026 09:07:06 Assinado por LOGIN E SENHA por: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA
BIANCA MARQUES AMADO LAET RODRIGUES	19/02/2026 14:01:21 Assinado por LOGIN E SENHA por: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues



Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 16ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**

Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 01320/3896/2023 **Processo Medição:** 00628/3096/2024

SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 12/02/2026 **Período de Avaliação:** 01/01/2026 a 31/01/2026

Nº da Parcela: 016 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade Qlde.	Contr+Aditiv	Qlde. Acum.	Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01-00.000	LICITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS										
01-01.000	PROJETOS										
01.01.001	PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.085,89390	208.589,39000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.002	FUNDAÇÕES	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	284,44010	28.444,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.003	ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.004	ESTRUTURA METÁLICA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	379,25340	37.925,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.005	HIDROSSANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.006	ELÉTRICO, LUMINOTÉCNICO E SPDA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.007	DADOS E VOZ (CABEAMENTO ESTRUTURADO), SOM, ALARME, CFTV	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	455,10410	45.510,41000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.008	AR CONDICIONADO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	568,88010	56.888,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.009	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	227,55210	22.755,21000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.010	TRATAMENTOS (IMPERMEABILIZAÇÕES, ACÚSTICA, ISOLAMENTOS)	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	113,77600	11.377,60000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.011	SEGURANÇA DO TRABALHO - NR18 E NR35	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	56,88800	5.688,80000	0,00000	0,00000	0,00000
01.01.012	ARTE GRÁFICA, COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00%	132,73870	13.273,87000	0,00000	0,00000	0,00000
01-02.000	LICENCIAMENTO										

Diretoria de Tecnologia da Informação RL_MEDICOES Analítica BIANCA MARQUES 20/02/2026 Página : 1 Continua...

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmp Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/02/2026 09:36:59

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 20/02/2026 09:07:07

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 20/02/2026 08:54:59

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 12535ABEU24867C8 | SGD:2026/38969/007395





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 16ª PARCELA

Contratada: 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA

Processo: 01320/3896/2023 Processo Medição: 00628/3096/2024

Data da Subcontratação: 12/02/2026 Período de Avaliação: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data da Parcela: 000220012024 Data da O.S.: 24/06/2024 Data Assin.: 28/05/2024

Nº da Parcela: 016

Rodovia:

Local: PALMAS
 Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde.	Contr.	Aditiv.	Qtde.	Acumulada	Ant.	Qtde.	Realiz.	no Período	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.02.001	ALVARÁ DE CONTRUÇÃO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	94,81340	9.481,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.02.002	ALVARÁ CORPO DE BOMBEIROS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	94,81340	9.481,34000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.000	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL																
01.03.001	SERVIÇOS GERAIS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	4.702,74250	470.274,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	%	100,00000	7,68925	0,00000	7,68925	7,68925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,69%	7.205,81510	720.581,51000	55.407,31376	0,00000	55.407,31376
01.03.003	LIMPEZA DE TERRENO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	227,55210	22.755,21000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.004	MOVIMENTO DE TERRAS	%	100,00000	6,45491	0,00000	6,45491	6,45491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,45%	910,20820	91.020,82000	5.875,31201	0,00000	5.875,31201
01.03.005	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES)	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	12.325,73640	1.232.573,64000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.006	SUPER-ESTRUTURA	%	100,00000	29,15261	0,00000	29,15261	29,15261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,15%	35,991,15030	3.599.115,03000	1.049,235,96815	0,00000	1.049,235,96815
01.03.007	ALVENARIAS	%	100,00000	3,37065	0,00000	3,37065	3,37065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,37%	10.239,84280	1.023.984,28000	34.514,92546	0,00000	34.514,92546
01.03.008	ESQUADRIAS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	21,863,98010	2.186.398,01000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.009	COBERTURA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	4.702,74250	470.274,25000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.010	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	948,13360	94.813,36000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.011	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	6.636,93500	663.693,50000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.012	COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.711,66200	271.166,20000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.013	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALARME INCENDIO, SOM, RELOGIO, CHAM ENFERM.	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	7.585,06860	758.506,86000	0,00000	0,00000	0,00000

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/02/2026 09:36:59
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 20/02/2026 09:07:07
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 20/02/2026 08:54:59
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/verificador> informando o código: 12535ABE024867C8 | SGD:2026/38969/0017395

AGETO
 Fls 1434
 Bb





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 16ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 0490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**

Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 01320/3896/2023 **Processo Medição:** 00628/3096/2024

SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 12/02/2026 **Período de Avaliação:** 01/01/2026 a 31/01/2026

Nº da Parcela: 016 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS

Objeto: 01 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

Item	Descrição do Serviço	Unidade Qtde.	Contr+Aditiv	Qtde.	Acumulada	Ant.Qtde.	Realiz.	no Período	Qtde.	Acum.	Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.03.014	CABEAMENTO ESTRUTURADO, FIBRA OPTICA E CFTV	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.161,74450	216.174,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.015	REVESTIMENTOS DE PAREDES	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	3.413,28090	341.328,09000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.016	REVESTIMENTO DE PISOS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	12.325,73640	1.232.573,64000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.017	REVESTIMENTOS DE TETOS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	1.934,19250	193.419,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.018	LOUÇAS E METAIS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	2.554,77400	255.477,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.019	VIDROS	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	17.066,40430	1.706.640,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.020	PINTURA	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	3.280,54220	328.054,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.021	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ELEVADORES	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	13.585,16120	1.358.516,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01.03.022	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	%	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00%	9.185,82145	918.582,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
SubTotal Sub Item.....																	
SubTotal Item.....																	
Total Parcel.....																	
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência																	
Total Parcel.....																	

Diretoria de Tecnologia da Informação	RL_MEDICAOES	Análítica	BIANCA MARQUES	20/02/2026	Página : 3	Continua...
Bianca Marques Amado Laet Rodrigues	Engª Civil Camylla Ferreira César	Engº Civil Candido F. Colino Jr	Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas	Superintendente de Obras Públicas		
Fiscal/ageito/sop/dfmop						
<p>ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/02/2026 09:36:59</p> <p>ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 20/02/2026 09:07:07</p> <p>ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 20/02/2026 08:54:59</p> <p>Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.io.gov.br/verificador informando o código: 12535ABED24867C8 SGD:2026/38969/007395</p>						

AGETO
 Fls 1435
 Bto





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 16ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** **Processo Medição:** 00628/3096/2024
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 01320/3896/2023 **Processo Medição:** 00628/3096/2024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 12/02/2026 **Período de Avaliação:** 01/01/2026 a 31/01/2026
Nº da Parcela: 016 **Nº da O.S.:** 000220012024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Local: PALMAS
Objeto: 02 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade Qlde.	Contr+AditivQlde.	Acumulada Ant.Qlde.	Realiz. no Período	Qlde. Acum. Atual	% acum.	Preço Unitário	Valor Contratado	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	PLANILHA APROVADA											
01.01.000	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA ALETO											
01.01.001	1ª FASE PROJETOS BÁSICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E SERVIÇOS TÉCNICOS	%	100,00000		0,00000	100,00000	100,00%	5.856,94340	585.694,34000	585.694,34000	0,00000	585.694,34000
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00000	59,11000	7,45000	66,56000	66,56%	9.082,94830	908.294,83000	536.893,07401	67.667,96484	604.561,03885
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00%	3.223,75930	322.375,93000	322.375,93000	0,00000	322.375,93000
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00000	90,00002	0,00000	90,00002	90,00%	587,53250	58.753,25000	52.877,93675	0,00000	52.877,93675
01.01.005	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00%	3.675,77830	367.577,83000	367.577,83000	0,00000	367.577,83000
01.01.006	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	%	100,00000	57,37310	0,00000	57,37310	57,37%	24.614,41130	2.461.441,13000	1.412.205,08096	0,00000	1.412.205,08096
01.01.007	VEDAÇÃO - PAREDES E PAINÉIS	%	100,00000	72,91464	3,99517	76,90981	76,91%	9.599,30560	959.930,56000	699.929,91207	38.350,65775	738.280,76983
01.01.008	FORRO	%	100,00000	20,60726	16,42274	37,03000	37,03%	5.161,48737	516.148,73700	106.364,11222	84.765,76509	191.129,87731
01.01.009	COBERTURA	%	100,00000	97,21059	0,00000	97,21059	97,21%	5.992,16562	599.216,56200	582.501,95530	0,00000	582.501,95530
01.01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	%	100,00000	89,21222	4,92778	94,14000	94,14%	2.388,19990	238.819,99000	213.096,61488	11.768,52370	224.825,13859
01.01.011	ESQUADRIAS	%	100,00000	62,62244	9,19756	71,82000	71,82%	18.344,92110	1.834.492,11000	1.148.803,72089	168.728,51251	1.317.532,23340
01.01.012	REVESTIMENTOS	%	100,00000	65,83032	13,65968	79,49000	79,49%	42.189,19080	4.218.919,08000	2.777.327,93091	576.290,84579	3.353.618,77669
01.01.013	PINTURA	%	100,00000	5,90956	11,91044	17,82000	17,82%	7.362,26440	736.226,44000	43.507,74321	87.687,80840	131.195,55161

Diretoria de Tecnologia da Informação RL_MEDICOES Analítica BIANCA MARQUES 20/02/2026 Página : 4 Continua...

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engº Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino Jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

AGETO
 Fls 1436
 [Assinatura]

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/02/2026 09:36:59
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 20/02/2026 09:07:07
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 20/02/2026 08:54:59
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 12535ABE124867C8 | SGD:2026/38969/007395





Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Medições de Obra

MEDIÇÃO DA 16ª PARCELA

Contrato: 00022/2024 **Contratada:** 04490079000137 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
Depto Executor: 1 **Data da SubContratação:** 01320/3896/2023 **Processo Medição:** 00628/3096/2024
SubContrato: 0 **Data da Parcela:** 12/02/2026 **Período de Avaliação:** 01/01/2026 a 31/01/2026
Nº da Parcela: 016 **Nº da O.S.:** 000220022024 **Data da O.S.:** 24/06/2024 **Data Assin.:** 28/05/2024

Total Parcela.....	11.103.402,46300	1.457.982,59661	12.561.385,05960
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência	0.00000	0.00000	0.00000
Total Parcela.....	11.103.402,46300	1.457.982,59661	12.561.385,05960
Total das Parcelas.....	12.248.435,98237	1.457.982,59661	13.706.418,57898

Importa o Líquido a pagar da medição em R\$ 1.457.982,59 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) Palmas-TO, 20 de fevereiro de 2026.

Diretoria de Tecnologia da Informação **RL_MEDICOES** Analítica **BIANCA MARQUES** 20/02/2026 **Página : 6** **FIM**

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Colino jr
 Fiscal/ageto/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/02/2026 09:36:59
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 20/02/2026 09:07:07
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 20/02/2026 08:54:59
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgdt.to.gov.br/verificador> informando o código: 125354BED24667C8 | SGD-2026/38969/007395

AGETO
 Fls 4438
 Bb



Contrato: 00022/2024 **SubContrato:** 0 **Empresa:** 04.490.079/0001-37 **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA**
Ob.: 01 - O.S.: 00022/0012 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
Ob.: 02 - O.S.: 00022/0022 - Local: PALMAS - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

Processo Medição: 00628/3096/2024
Data da Assinatura: 28/05/2024
Valor Contrato: 18.786.000,00
Valor dos Aditivos: 0,00
Valor Total Contrato: 18.786.000,00
Prazo: 549 Dias
Prorrogações Conced.: 90 Dias

Medição	Período da Medição	EXECUTADO										TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		PREÇO INICIAL (PI)					REAJUSTE						
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$	R\$ Acumulado	R\$	R\$	R\$		
1 a	24/06/2024 a 19/11/2024	601.116,67	3,19 %	601.116,67	3,19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.116,67	601.116,67
2 a	20/11/2024 a 15/12/2024	933.782,05	4,97 %	1.534.898,72	8,17 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.782,05	1.534.898,72
3 a	16/12/2024 a 31/12/2024	283.918,43	1,51 %	1.818.817,15	9,68 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.918,43	1.818.817,15
4 a	01/01/2025 a 31/01/2025	395.058,70	2,10 %	2.213.875,85	11,78 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,70	2.213.875,85
5 a	01/02/2025 a 28/02/2025	638.331,24	3,39 %	2.852.207,09	15,18 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.331,24	2.852.207,09
6 a	01/03/2025 a 31/03/2025	111.643,57	0,59 %	2.963.850,66	15,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.643,57	2.963.850,66
7 a	01/04/2025 a 30/04/2025	606.681,32	3,22 %	3.570.531,98	19,00 %	51.593,39	51.593,39	51.593,39	51.593,39	51.593,39	51.593,39	658.274,71	3.622.125,37
8 a	01/05/2025 a 31/05/2025	436.769,37	2,32 %	4.007.301,35	21,33 %	37.143,74	37.143,74	88.737,13	88.737,13	88.737,13	88.737,13	473.913,11	4.096.038,48
9 a	01/06/2025 a 30/06/2025	712.121,47	3,79 %	4.719.422,82	25,12 %	60.560,23	60.560,23	149.297,36	149.297,36	149.297,36	149.297,36	772.681,70	4.868.720,18
10 a	01/07/2025 a 31/07/2025	359.159,70	1,91 %	5.078.582,52	27,03 %	30.543,65	30.543,65	179.841,01	179.841,01	179.841,01	179.841,01	389.703,35	5.258.423,53
11 a	01/08/2025 a 30/08/2025	692.582,46	3,68 %	5.771.164,98	30,72 %	58.898,59	58.898,59	238.739,60	238.739,60	238.739,60	238.739,60	751.481,05	6.009.904,58
12 a	01/09/2025 a 30/09/2025	1.496.399,98	7,96 %	7.267.564,96	38,68 %	127.256,84	127.256,84	365.996,44	365.996,44	365.996,44	365.996,44	1.623.656,82	7.633.561,40
13 a	01/10/2025 a 31/10/2025	1.581.953,81	8,42 %	8.849.518,77	47,10 %	134.532,51	134.532,51	500.528,95	500.528,95	500.528,95	500.528,95	1.716.486,32	9.350.047,72
14 a	01/11/2025 a 30/11/2025	1.542.304,81	8,20 %	10.391.823,58	55,31 %	131.160,68	131.160,68	631.689,63	631.689,63	631.689,63	631.689,63	1.673.465,49	11.023.513,21
15 a	01/12/2025 a 31/12/2025	1.856.612,33	9,88 %	12.248.435,91	65,19 %	157.890,02	157.890,02	789.579,65	789.579,65	789.579,65	789.579,65	2.014.502,35	13.038.015,56

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Collino Jr
 Fiscal/ageto/sop/difmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/02/2026 09:37:00
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 20/02/2026 09:07:29
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 20/02/2026 08:54:59
 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.io.gov.br/v/verificador> informando o código: 7CB78C95024667DA | SGD:2026/38969/007395

AGETO
 Fls 1439






Governo do Estado do Tocantins
 Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00
 Relatório de Faturamento

Contrato: 00022/2024 SubContrato: 0 Empresa: 04.490.079/0001-37 CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA Processo Medição 00628/3096/2024

Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)		REAJUSTE		TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.		
16 a	01/01/2026 a 31/01/2026	1.457.982,59	7,76 %	13.706.418,50	72,96 %	1.581.972,34	14.619.987,90
				123.989,75		913.569,40	

EXECUTADO

Diretoria de Tecnologia da Informação RL_Faturamento BIANCA MARQUES 20/02/2026 Página : 2

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues Engª Civil Camylla Ferreira César Engº Civil Candido F. Collino Jr
 Fiscal/ageito/sop/dfmop Dir. de Fiscalização e Medição de Obras Públicas Superintendente de Obras Públicas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 20/02/2026 09:37:00
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 20/02/2026 09:07:29
 ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 20/02/2026 08:54:59

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.ito.gov.br/verificador> informando o código: 7C0378C95024867DA | SGD:2026/38969/007395



AGETO
 Fls 1440
 JB



FOTOGRAFICO RELATÓRIO

1º JAN 1989
ESTADO DO TOCANTINS

CONTRATO:00022/2024

OBRA : ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

VISITA : 10/02/2026 REFERENTE À 16ª MEDIÇÃO

LOCAL : PALMAS


EMPRESA : CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA




de Tec

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Bianca Marques Amado Laet Rodrigues EM 20/02/2026 08:55:00


Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4A00EA1A024867F4 | SGD:2026/38969/007395

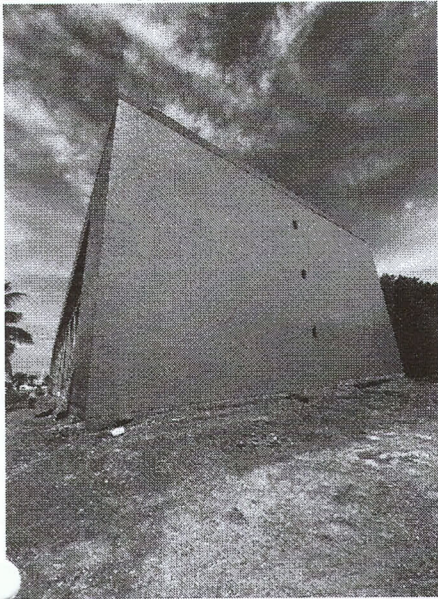

=> REVESTIMENTO EXTERNO COM LITOCERÂMICA -
FACHADA LATERAL DIREITA

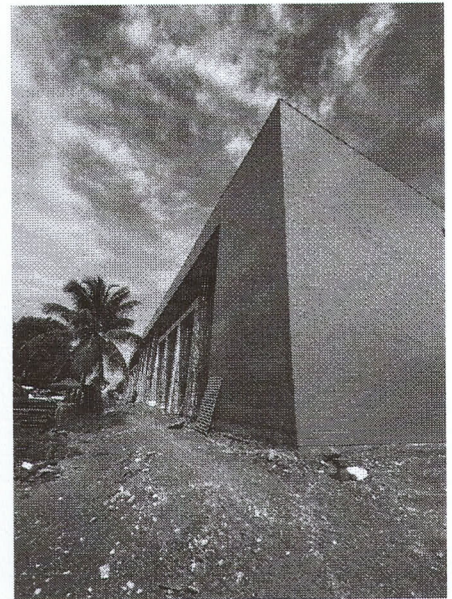

=> REVESTIMENTO EXTERNO COM LITOCERÂMICA -
FACHADA FRONTAL NA DIAGONAL


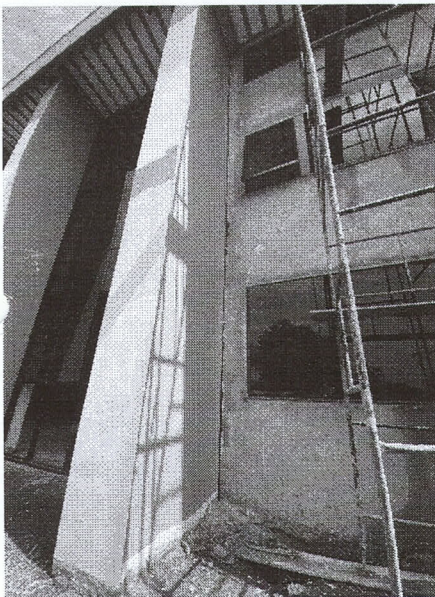


=> PELE DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO
NA FACHADA FRONTAL - COR CINZA





=> TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO NA FACHADA
FRONTAL - DETALHE - COR CINZA



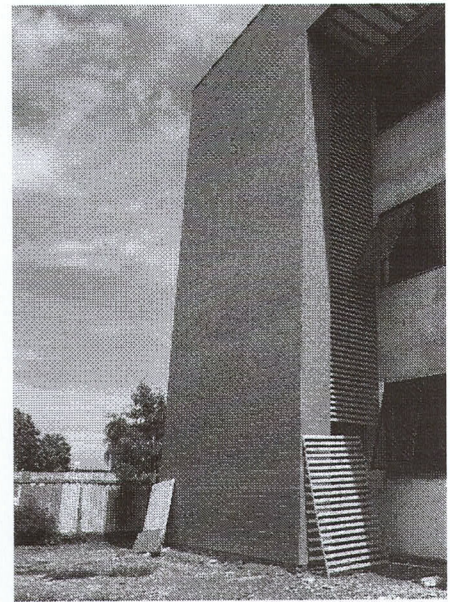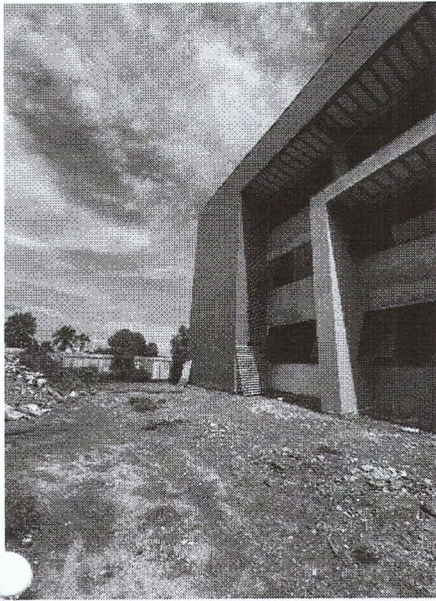

=> REVESTIMENTO EXTERNO COM LITOCERÂMICA -
FACHADA FRONTAL ESQUERDA

=> REVESTIMENTO EXTERNO COM LITOCERÂMICA -
FACHADA FRONTAL ESQUERDA DETALHE

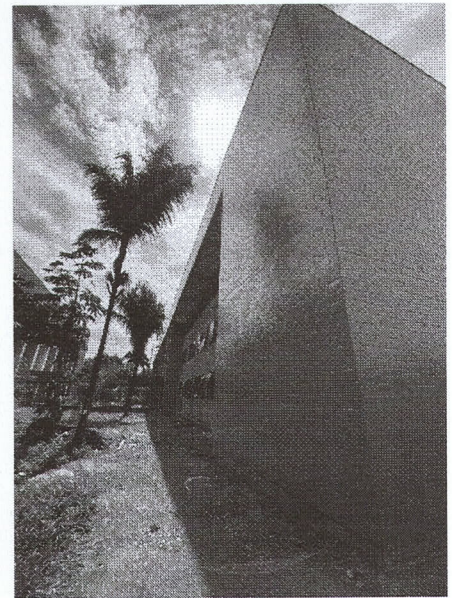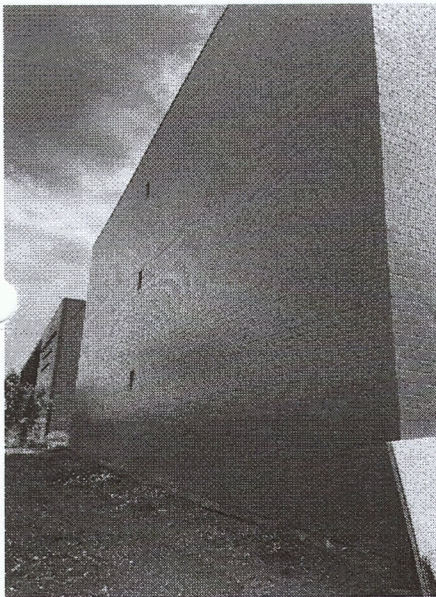


=> REVESTIMENTO EXTERNO COM LITOCERÂMICA -
FACHADA LATERAL ESQUERDA

=> REVESTIMENTO EXTERNO COM LITOCERÂMICA -
POSTERIOR ESQUERDA DETALHE






=> PELE DE VIDRO - FACHADA POSTERIOR ESQUERDA

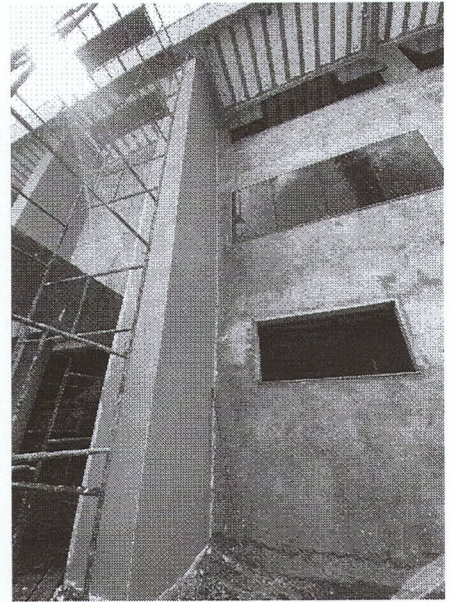

=> PELE DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO NA FACHADA POSTERIOR- COR BRANCA




=> TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO NA FACHADA POSTERIOR - DETALHE - COR BRANCA

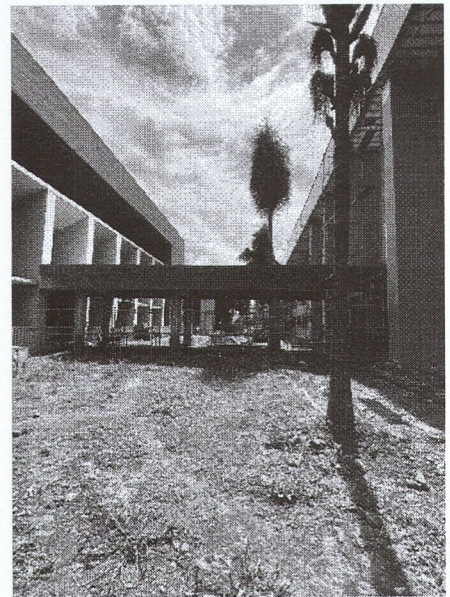


=> CONEXÃO COM O PRÉDIO PRINCIPAL



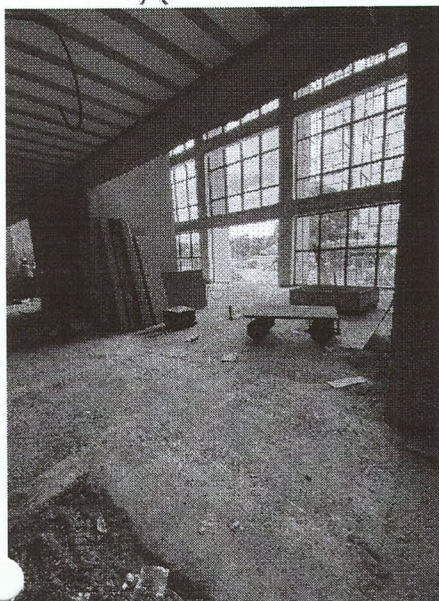

=> RECEPÇÃO

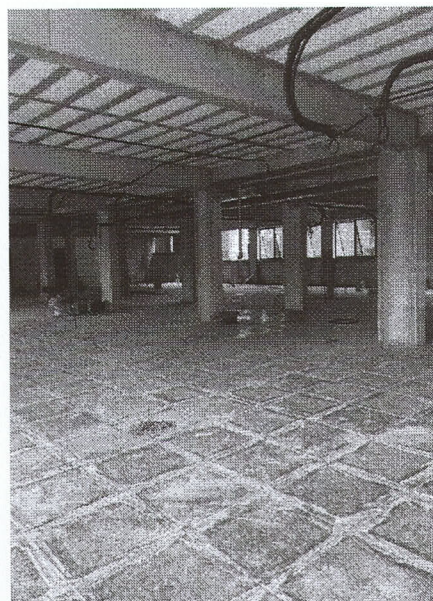

=> REVESTIMENTO - PISO EM GRANITO - TÉRREO




=> REVESTIMENTO LITOCERÂMICO INTERNO - ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA LADO DIREITO




=> PINTURA EM PAREDE INTERNA - DETALHE




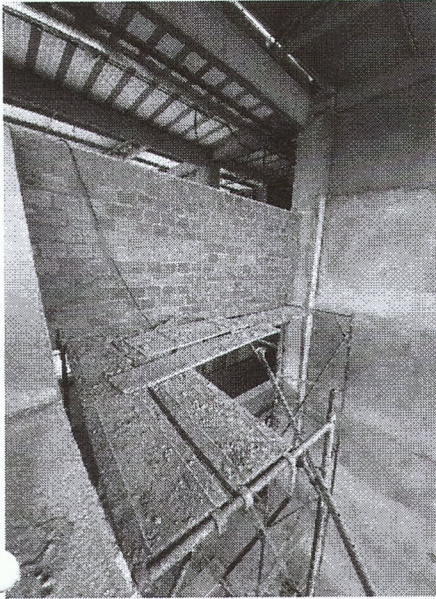


=> REVESTIMENTO COM LITOCERÂMICA - PAREDE INTERNA - DETALHE

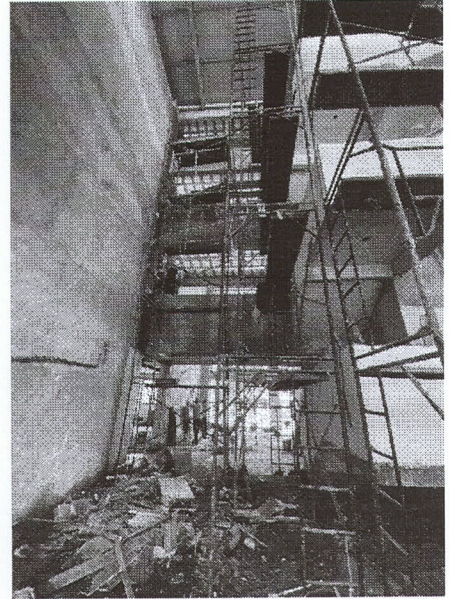

=> REVESTIMENTO LITOCERÂMICO INTERNO - ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA LADO ESQUERDO

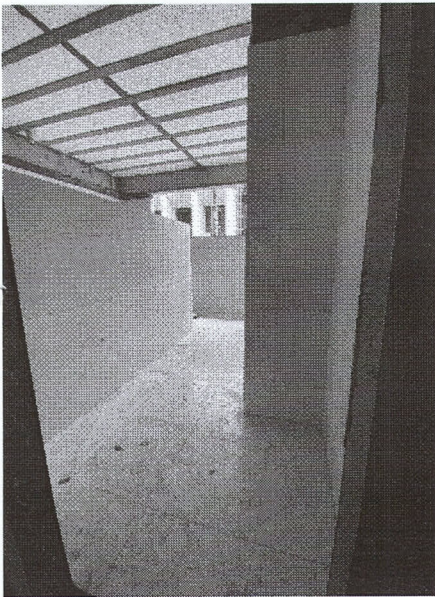


=> REVESTIMENTO CERÂMICO -TERREO

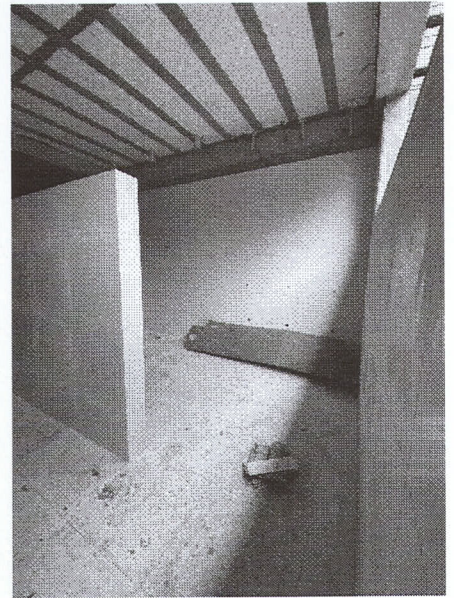


=> REVESTIMENTO CERÂMICO -TERREO




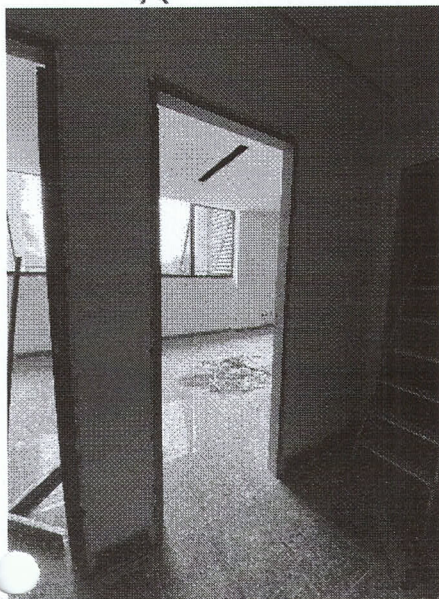

=> FORRO, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNA E DE PISOS - 1 PAVIMENTO

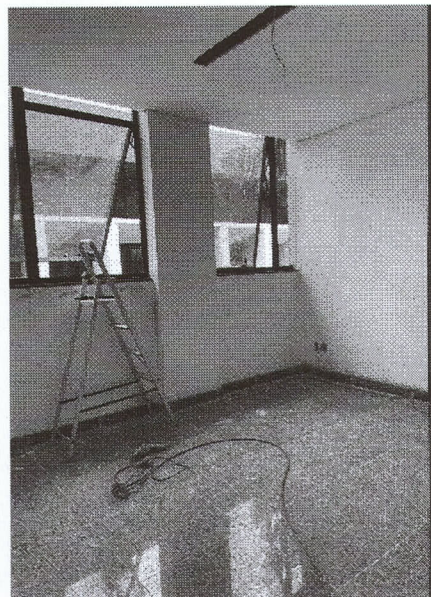

=> FORRO, EMASSAMENTO E RODAPÉ - 1 PAVIMENTO

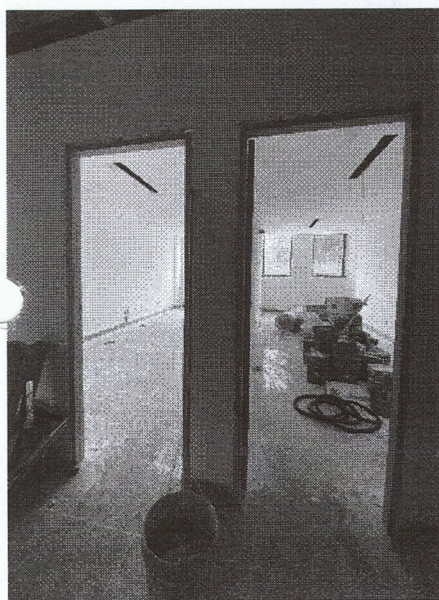

=> PORTA DE MADEIRA DE 80 E 90 CM




=> FORRO, EMASSAMENTO, RODAPÉ, PORTA - 1 PAVIMENTO







=> FORRO EM DRYWALL - 1 PAVIMENTO

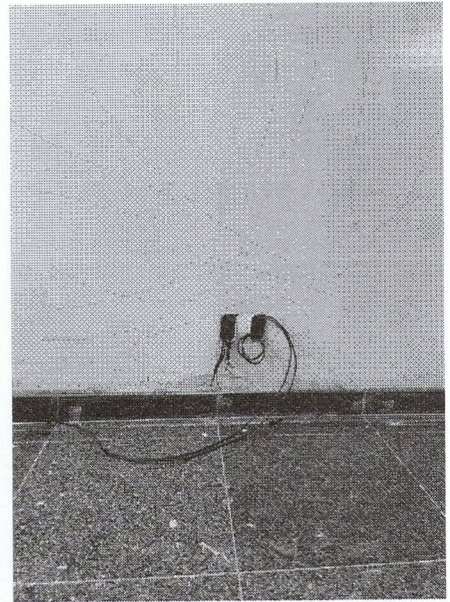

=> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1 PAVIMENTO

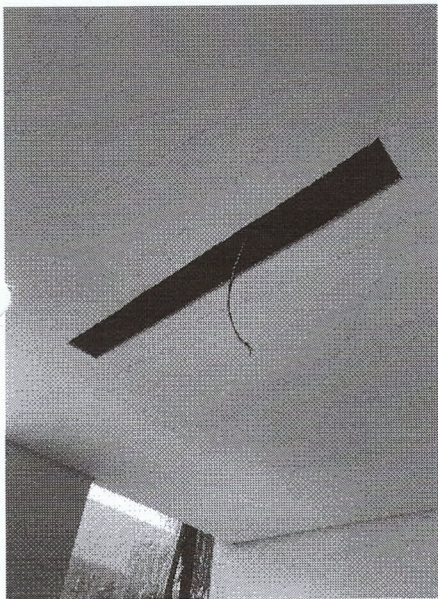


=> FORRO EM DRYWALL

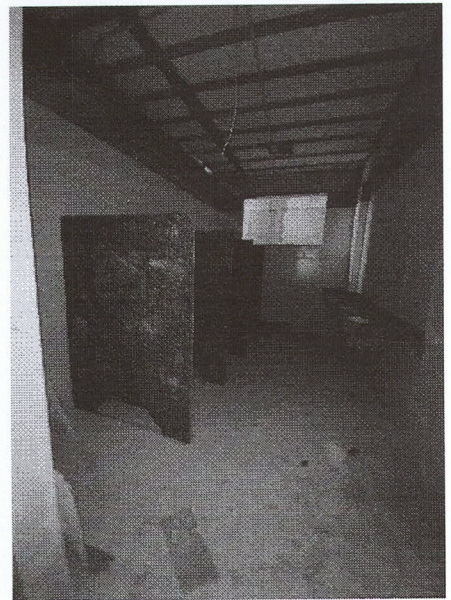

=> DIVISÓRIA SANITÁRIA - 1 PAVIMENTO




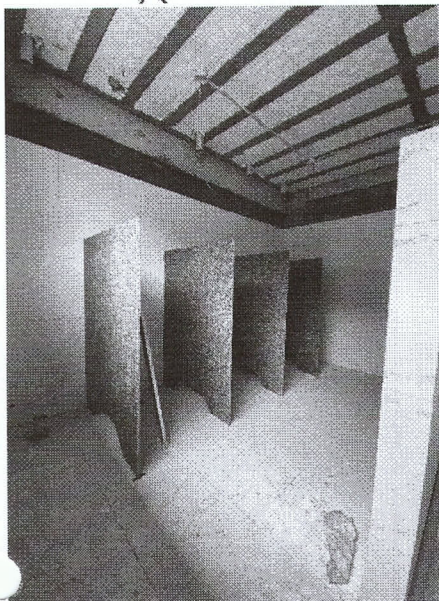


=> DIVISÓRIA SANITÁRIA - 1 PAVIMENTO



=> DIVISÓRIA SANITÁRIA - 1 PAVIMENTO

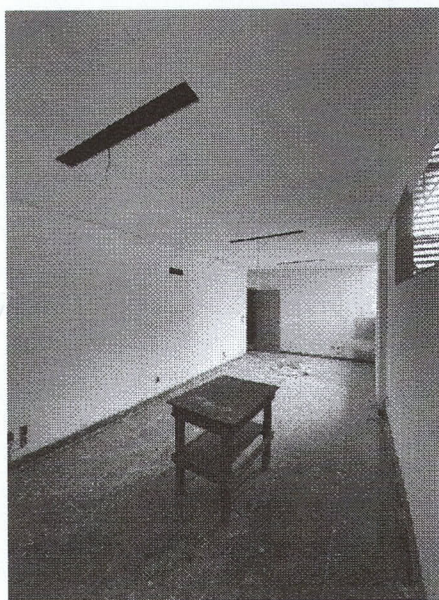


=> FORRO, RODAPÉ E PINTURA - 1 PAVIMENTO

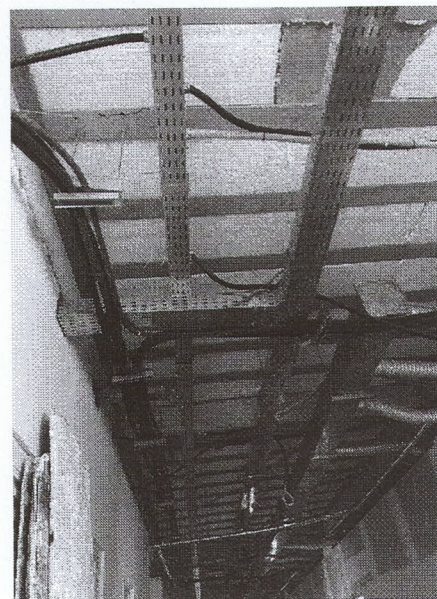

=> CABO VERMELHO - SISTEMA DE CFTV - 1 PAVIMENTO




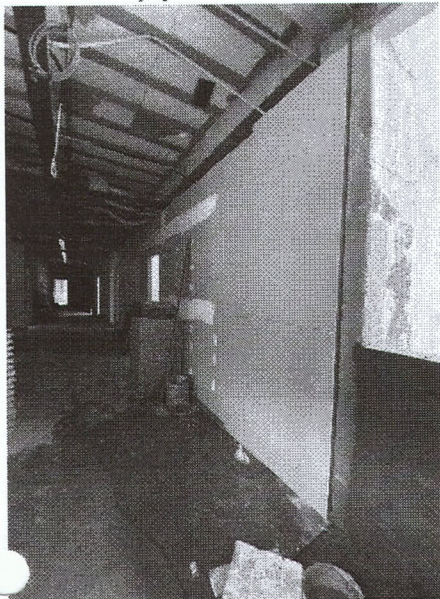


=> CABO VERMELHO - SISTEMA DE CFTV - 1 PAVIMENTO



=> VEDAÇÃO - 1 PAVIMENTO

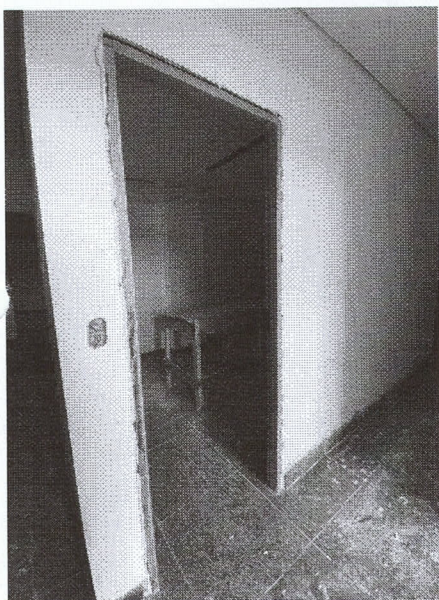


=> PORTAS E ACABAMENTO DAS PAREDES

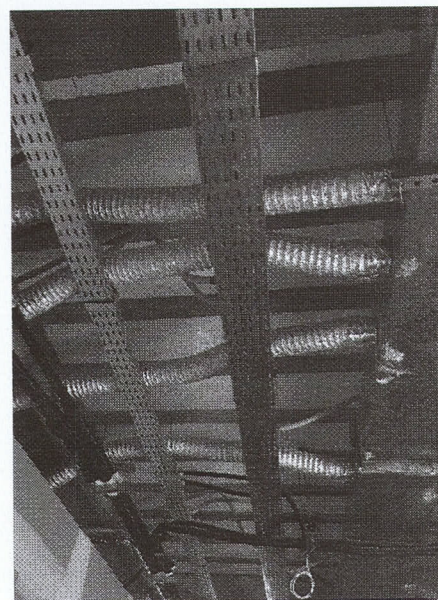

=> INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - COR AZUL



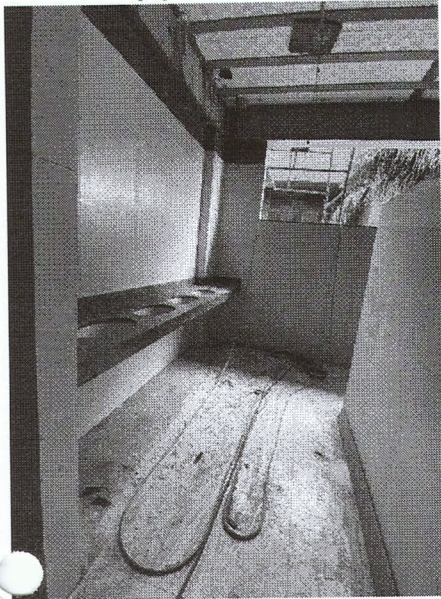


=> REVESTIMENTO CERÂMICO - 1 PAVIMENTO



=> SISTEMA DE AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO TIPO CASSETE



=> FORRO EM DRYWALL E SISTEMA DE AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO TIPO CASSETE

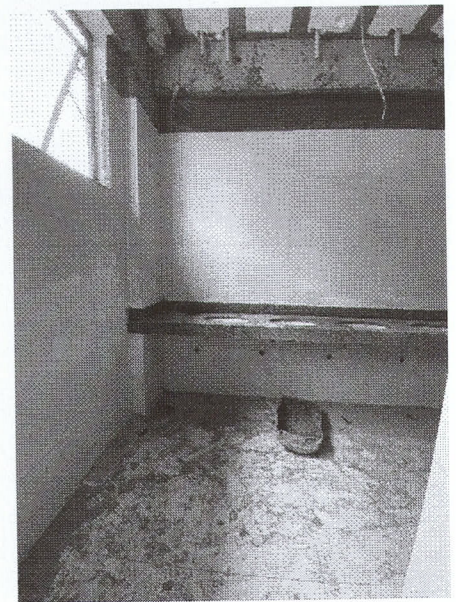

=> REVESTIMENTO CERÂMICO





MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/02/2026 18:22:46** Reg. Especial Tributação **Nenhum**

Período de Competência **02/2026** Exigibilidade do ISS **Exigível em Palmas**

Município de Prestação do Serviço **Palmas - TO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA ACAUA LTDA

Nome Fantasia

CONSTRUTORA ACAUA

CPF/CNPJ

04.490.079/0001-37

Inscrição Municipal

187879

Inscrição Estadual

294001417

Simples Nacional

Não

Email

acaua@acaua.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3216-1855

AGETO
Fls 1452
Bto

Endereço

Quadra ASR SE 105 Alameda 11, sn, LOTE 11-A QI-E, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-670 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CPF/CNPJ

25.053.125/0001-00

Inscrição Municipal

502146

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3212-5148

E-mail

cofin@al.to.leg.br

Endereço

Praça Girassóis, s/n, 0, Prédio - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-902 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, COM MATERIAL INCLUSO.

CNO Nº 90.021.02664/75 - ART Nº TO20240504592
PROCESSO Nº: 2023/38960/001320 - AGETO
PROCESSO Nº: 285/2024 - ALETO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023

BASE DE CÁLCULO ISSQN (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

MATERIAIS: 30% - R\$ 437.394,78
MÃO-DE-OBRA: 70% - R\$ 1.020.587,81
VALOR TOTAL: 100% - R\$ 1.457.982,59

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1505-9
CONTA CORRENTE: 142.687-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	17.495,79	0,00	0,00

VALORES

Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Aliquota ISS (%)
0,00	0,00	0,00	1.457.982,59	5,00
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.457.982,59	*****	72.899,13	1.367.587,67	1.457.982,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 196.098,66 Federal e R\$ 72.899,13 Municipal. Fonte: IBPT [47C8DA]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 2403 - ART: TO20240504592
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 1721000120449007900013726000000000426020336329894

Visualizado em: 23/02/2026 18:22:47 | Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 089FC5B502494488 | SGD:2026/38969/008038

Contrato nº 22/2024

PROCESSO: 2024/38960/000628

ASSUNTO: MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0022/2024 – OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO.

INTERESSADO: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

ATESTO

ATESTO à nota fiscal nº 004/2026, no valor de R\$ 1.457.982,59 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Referente à 16ª Medição Parcial da Execução da Construção do Prédio Anexo da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins no município de Palmas - TO. A Nota Fiscal foi satisfatoriamente recebida e o seu valor está de acordo.

Palmas – TO, 24 de fevereiro de 2026.

Assinatura Digital

Bianca Marques Amado Laet Rodrigues

FISCAL DE OBRA

Matrícula: 11809019

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77001-970 – Palmas/TO | (63) 3218-7101/7104
E-mail: gabpres@ageto.to.gov.br





**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. b6b76132

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA

CNPJ n. 04.490.079/0001-37

Certidão emitida em: 03/02/2026, às 17:34:06 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquiridos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento n.º 11/2019, Portaria n.º 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 03/02/2026, 17:34:06






GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

7648695



Validador

05645158518647405097657369732864

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ACAUA LTDA

CNPJ : 04.490.079/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: QD. 1012 SUL, S/N, ECO INDUSTRIAL - PLANO DIR.SUL - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 20 de Fevereiro de 2026 - 14h 18m 05s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins [http:// www.to.gov.br/sefaz](http://www.to.gov.br/sefaz)



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1C5BC3CC0249448D | SGD:2026/38969/008038



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
CNPJ: 04.490.079/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:18 do dia 04/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2026.

Código de controle da certidão: **32C1.6EF4.E52E.D38C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.490.079/0001-37
Razão Social: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Endereço: Q ASR SE 105 ALAMEDA 11 S/N LOTE 11-A QI-E / PLANO DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77023-670

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021819361426154164

Informação obtida em 20/02/2026 14:17:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





AGETO
Fls 1458
13/02

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **04.490.079/0001-37**

Contribuinte: **CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA** Inscrição: 187879

Endereço oficial: **ASR SE 105, ALAMEDA 11, QI-E, LOTE 11-A, LOTE 11-A QI-E, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **1012 S, ALAMEDA 11, Nº S/N, LOTE 11-A QI-E, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria Municipal da Fazenda, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **04.490.079/0001-37**
Código de validação: **fcdec.396f4.a6e43-1359908**

Palmas, 20 de Fevereiro de 2026 às 14:18.

Certidão válida até 21 de Abril de 2026





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.490.079/0001-37 DUNS®: 89*****69
Razão Social: CONSTRUTORA ACAUA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ACAUA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	19/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/08/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal


Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2026
Receita Municipal	Validade:	21/04/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ACAUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.490.079/0001-37

Certidão nº: 11174688/2026

Expedição: 20/02/2026, às 14:17:14

Validade: 19/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ACAUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.490.079/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





AGÊNCIA DE TRANSPORTES,
OBRAS E INFRAESTRUTURA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



AGETO
Fis 1461
Ago

PROCESSO Nº: 2024/38960/000628

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE PALMAS.

ASSUNTO: PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO PARCIAL

PARA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS

DESPACHO Nº 014/2026/DFMOP

SGD: 2026/38969/008967

Anexados aos autos a Nota Fiscal, Atesto e Certidões da 16ª Medição Parcial. Encaminhamos o referido processo a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins - ALETO, para análise e providências.

Palmas, 27 de fevereiro de 2026.

(Assinado Digitalmente)

CAMYLLA F. CESAR BARBOSA

Dir. de Fisc. e Med. de Obras Públicas

Mat.: 1050621

(Assinado Digitalmente)

CANDIDO F. COLINO JR

Superintendente de Obras Públicas

Mat.: 604061



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CANDIDO FERREIRA COLINO JUNIOR EM 27/02/2026 12:08:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAMYLLA FERREIRA CESAR BARBOSA EM 27/02/2026 11:52:36

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 8573D415024A8585 | SGD:2026/38969/008967
